



Bericht Q2/2024

GMW
INVESTITIONSCONTROLLING



Wuppertal, den 14.08.2024

STADT WUPPERTAL / GEBÄUDEMANAGEMENT

Inhaltsverzeichnis

Reporting Q2/2024

- Zusammenfassung 3
- Anzahl der Maßnahmen und Investitionen nach aktueller Beschlusslage 4
- Neue Beschlüsse und Fertigstellungen 5
- Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 6
- Übersicht über die Prognose und Indexierung aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 8
- Erläuterung der 10 größten absoluten Abweichungen der Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 9
- Prognose der Leistungsphase und Stand der Kostenermittlung zum 31.12.2024 aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 10
- Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen ohne Beschluss und mit Grundsatzbeschluss 12
- Zur Verfügung stehende Mittel gegenüber Leistungsprognose 13
- Aktueller Auszahlungsstand gegenüber geplanten Auszahlungen 2024 laut Wirtschaftsplan 14

Ausblick 15

Glossar 17

- Abkürzungsverzeichnis 18



Reporting Q2/2024

Zusammenfassung

- In Q2/2024 hat der Rat der Stadt Wuppertal für zwei weitere Maßnahmen (Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 und Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134) die Durchführung beschlossen. Die Gesamtsummen der Durchführungsbeschlüsse wurden um die enthaltenen Beträge für loses Inventar (Umsetzung erfolgt nicht durch das GMW) bereinigt.
- Der geplante Mehrkostenbeschluss (Abriss und Neubau des Freibades Mählersbeck) aus Q1/2024 wurde vom Rat der Stadt Wuppertal in der Sitzung am 01.07.2024 beschlossen. Die Mehrkosten liegen bei 2,6 Mio. EUR.
- Im Vergleich zu den Beschlussfassungen steigen die Investitionen für Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss um 10,2 Mio. EUR. Davon beruhen etwa 2,5 Mio. EUR auf der theoretischen Kostensteigerung (Indexberechnung).
- Die Finanzierung ist im Zeitraum von 2024 bis 2028 mit einem Überhang von 34,5 Mio. EUR gedeckt.
- Für die Gesamtsanierung und den Umbau des Berufskollegs am Haspel, Schluchtstraße 30 ist aufgrund der sich veränderten Bildungsstruktur und somit auch grundlegend anderen Kundenbedarf ein neuer Grundsatzbeschluss erforderlich. Die Einbringung der Beschlussvorlage ist für das zweite Halbjahr 2024 geplant.

Reporting Q2/2024

Anzahl der Maßnahmen und Investitionen nach aktueller Beschlusslage in Mio. EUR

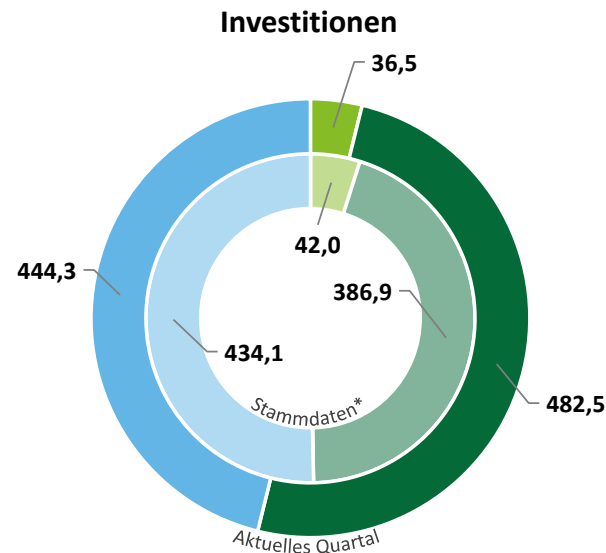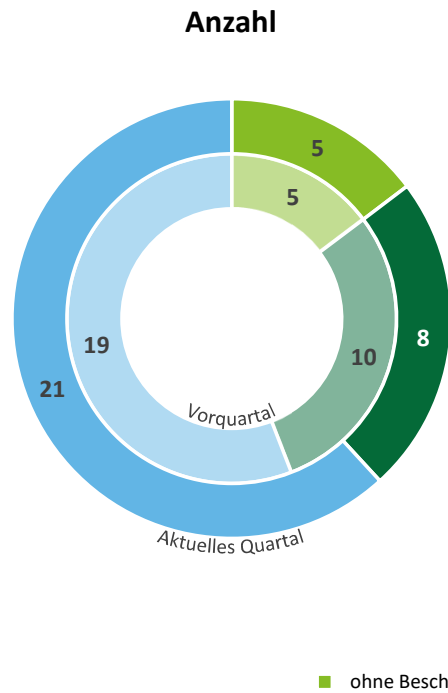

Änderungen

Beschlusstand:

- Zwei neue Durchführungsbeschlüsse

Investitionen der Maßnahmen nach Beschlusslage:

- Maßnahmen ohne Beschluss:
- 5,5 Mio. EUR (-13,2%)
- Maßnahmen mit Grundsatzbeschluss:
+ 95,6 Mio. EUR (+24,7%)
- Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss:
+ 10,2 Mio. EUR (+2,4%)

*Bei Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss wird der aktuelle Stand zur Beschlusslage verglichen. Bei Maßnahmen ohne Beschluss und Grundsatzbeschluss wird gegen den Stand des letzten Berichtsquartals berichtet.

Reporting Q2/2024

Neue Beschlüsse und Fertigstellungen

Neue Beschlussfassungen

M-ID & Beschreibung			Beschlussart	
M-13-00036	Langerfeld-Beyenburg	107 : Gesamtschulen	Durchführungsbeschluss	Am 01.07.2024 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen.
Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW				
M-15-00115	Barmen	104 : Gymnasien	Durchführungsbeschluss	Am 01.07.2024 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen.
Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtanierung				
M-16-00125	Oberbarmen	301 : Bäder	Mehrkostenbeschluss	Am 01.07.2024 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen.
Freibad Mählersbeck / Abriss und Neubau des Freibades				

- M-13-00036** **Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250:** Bei der 1988 gegründeten Gesamtschule, welche von rd. 1300 Schülern besucht wird, ist eine Sanierung und Erweiterung geplant. Bestandteil der Planung sind die Komplettsanierung, Erweiterung und Aufstockung von Haus 2 und 3, sowie die Errichtung eines Neubaus für naturwissenschaftlichen Unterricht. Alle Gebäude werden bis zum Rohbau entkernt und schadstofffrei saniert. Nach Sanierung und Erweiterung beträgt die Bruttogrundfläche ca. 21.500m².
- M-15-00115** **Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134:** Das seit 2006 in „Johannes-Rau“ umbenannte Ganztagsgymnasium soll nach den aktuellen pädagogischen Konzepten für bis zu 800 Schüler und 75 Lehrer saniert bzw. erweitert werden. Anstelle der bisherigen Turnhalle entsteht ein Neubau mit einer Einfachsporthalle , einer Mensa sowie weiteren Klassen- bzw. Fachräumen. Nach der erfolgter Gesamtanierung und Erweiterung beträgt die Bruttogrundfläche ca. 15.000m².

Fertiggestellte Maßnahmen

M-ID & Beschreibung			Fertigstellung
M-20-00064	Barmen	104 : Gymnasien	Die Übergabe hat am 08.04.2024 stattgefunden.
Ganztagsgymnasium Johannes-Rau / Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg			

Reporting Q2/2024

Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss (1/2)

M-ID & Beschreibung	Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Inbetriebnahme	
				Vorquartal	Q2/2024		
M-14-00072 Grundschule Peterstraße Gesamtsanierung	101 : Grundschulen Barmen	VO/0467/23	9	in Betrieb	in Betrieb	07.08.2023	✔
M-16-00072 GGS Gewerbeschulstraße Neubau OGGS	101 : Grundschulen Barmen	VO/1004/22	5	30.09.2026	31.12.2026	-	●
M-14-00167 Gemeinschaftsgrundschule Haselrain Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	101 : Grundschulen Oberbarmen	VO/1221/23	8	30.09.2024	30.09.2024	-	●
M-16-00119 Grundschule Hainstraße Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	101 : Grundschulen Uellendahl-Katernberg	VO/1221/23	8	31.03.2025	30.06.2025	-	●
M-17-00052 Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstraße 6 Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	102 : Hauptschulen Langerfeld-Beyenburg	VO/1192/22	8	in Betrieb	in Betrieb	07.08.2023	✔
M-15-00088 Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 Gesamtsanierung	103 : Realschulen Barmen	VO/0140/23	3	31.03.2032	31.03.2032	-	●
M-15-00075 Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	103 : Realschulen Vohwinkel	VO/0059/23	5	31.12.2026	31.12.2026	-	●
M-15-00115 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 Gesamtsanierung	104 : Gymnasien Barmen	VO/0538/24 /1-Neuf.	3	/	30.06.2030	-	●
M-20-00064 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg	104 : Gymnasien Barmen	VO/1192/22	8	30.06.2024	in Betrieb	08.04.2024	✔
M-16-00080 Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße Neubau C-Trakt_Gesamtsanierung K-Trakt	104 : Gymnasien Elberfeld-West	VO/1221/23	8	31.12.2024	31.03.2025	-	●
M-16-00075 Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 Gesamtsanierung und Erweiterung	106 : Förderschulen Oberbarmen	VO/1221/23	8	31.03.2025	30.06.2025	-	●

Anmerkung: Über alle Maßnahmen, für die aktuell ein Durchführungsbeschluss vorliegt, kann im Detail berichtet werden, da mit dem Durchführungsbeschluss eine valide Kostenberechnung vorhanden ist (ab Leistungsphase 3). Zudem ist die Kostenerhöhung durch die Fortschreibung der Indizierung berücksichtigt.

Reporting Q2/2024

Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss (2/2)

M-ID & Beschreibung	Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Inbetriebnahme	
				Vorquartal	Q2/2024		
M-13-00036 Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	107 : Gesamtschulen Langerfeld-Beyenburg	VO/0507/24 /1-Neuf.	3	/	30.06.2031	-	●
M-20-00082 Städtische Kindertagesstätte, Leibuschstraße 37 Neubau einer 4 gruppigen TfK	201 : Kindertagesstätten Langerfeld-Beyenburg	VO/0912/23	1	30.09.2026	31.12.2026	-	●
M-16-00033 Städtische Kindertagesstätte, Grafenstraße 11 Neubau einer 6 gruppigen TfK	201 : Kindertagesstätten Oberbarmen	VO/0911/23	1	30.09.2027	30.06.2027	-	●
M-16-00125 Freibad Mählersbeck Abriss und Neubau des Freibades	301 : Bäder Oberbarmen	VO/0232/24	8	31.12.2024	31.12.2024	-	●
M-16-00106 Historisches Zentrum Wuppertal, Engelsstraße 10 Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum	304 : Historisches Zentrum Barmen	VO/1192/22	8	in Betrieb	in Betrieb	15.04.2024	✓
M-18-00010 Engels-Haus, Engelsstraße 10 Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption	304 : Historisches Zentrum Barmen	VO/0917/22 /Neuf.	8	30.06.2024	30.09.2024	-	●
M-20-00090 Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Straße 4 Sanierung der Bühnentechnik, Podien, Punktzüge	307 : Opernhaus Barmen	VO/0593/22	8	30.09.2025	30.09.2025	-	●
M-14-00103 Turnhalle Hardenberg Neubau Turnhalle und Vereinsheim	308 : Sportplatzhäuser und Sporthallen Uellendahl-Katernberg	VO/1192/22	8	in Betrieb	in Betrieb	02.05.2024	✓
M-19-00043 Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Kemmannstr. Neubau einer Rettungswache	404 : Vermietung an Feuerwehr Cronenberg	VO/1192/22	9	in Betrieb	in Betrieb	10.10.2023	✓
M-18-00030 Werkstatt, Giebel 46 Abriss und Neubau Betriebs Hof	405 : Vermietung an 103 Elberfeld-West	VO/1456/22	5	31.12.2028	31.12.2028	-	●

Anmerkung: Über alle Maßnahmen, für die aktuell ein Durchführungsbeschluss vorliegt, kann im Detail berichtet werden, da mit dem Durchführungsbeschluss eine valide Kostenberechnung vorhanden ist (ab Leistungsphase 3). Zudem ist die Kostenerhöhung durch die Fortschreibung der Indizierung berücksichtigt.

Reporting Q2/2024

Übersicht über die Prognose und Indexierung aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss in Mio. EUR

M-ID & Beschreibung	IST			WiPI 2024	PLAN Beschluss	Abweichung			
	Prognose	Index	Gesamt			Prognose ggü. Beschluss			
M-14-00072	Grundschule Peterstraße / Gesamtanierung	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0	+0,0%	●
M-16-00072	GGs Gewerbeschulstraße / Neubau OGGS	15,2	1,4	16,6	14,4	15,4	1,1	+7,3%	●
M-14-00167	Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	17,1	0,0	17,1	16,8	16,8	0,3	+1,7%	●
M-16-00119	Grundschule Hainstraße / Gesamtanierung und Herrichtung zur OGS	14,0	1,6	15,6	16,9	15,6	0,0	+0,2%	●
M-17-00052	Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffsstraße 6 / Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	12,3	0,0	12,3	12,9	12,5	-0,1	-1,0%	●
M-15-00088	Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtanierung	40,3	18,7	59,0	56,7	53,3	5,7	+10,7%	●
M-15-00075	Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	27,4	7,7	35,1	31,9	32,9	2,2	+6,7%	●
M-15-00115	Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtanierung	54,0	16,6	70,6	62,7	70,6	0,0	+0,0%	●
M-20-00064	Ganztagsgymnasium Johannes-Rau / Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg	29,7	0,6	30,2	32,4	29,5	0,8	+2,6%	●
M-16-00080	Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt_Gesamtanierung K-Trakt	20,3	0,0	20,3	21,4	21,4	-1,1	-5,3%	●
M-16-00075	Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtanierung und Erweiterung	11,5	0,0	11,5	13,2	11,5	0,0	-0,0%	●
M-13-00036	Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	47,1	16,1	63,1	53,6	63,1	0,0	+0,0%	●
M-20-00082	Städtische Kindertagesstätte, Leibuschstraße 37 / Neubau einer 4 gruppigen TFK	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	-0,6%	●
M-16-00033	Städtische Kindertagesstätte, Grafenstraße 11 / Neubau einer 6 gruppigen TFK	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	+0,8%	●
M-16-00125	Freibad Mählersbeck / Abriss und Neubau des Freibades	19,3	0,0	19,3	16,7	19,3	0,0	+0,0%	●
M-16-00106	Historisches Zentrum Wuppertal, Engelsstraße 10 / Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum	12,1	0,0	12,1	12,7	11,5	0,6	+5,4%	●
M-18-00010	Engels-Haus, Engelsstraße 10 / Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption	2,2	0,0	2,2	2,5	2,7	-0,4	-16,1%	●
M-20-00090	Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Straße 4 / Sanierung der Bühnentechnik, Podien, Punktzüge	7,8	1,2	8,9	11,9	7,4	1,5	+20,3%	●
M-14-00103	Turnhalle Hardenberg / Neubau Turnhalle und Vereinsheim	4,5	0,0	4,5	5,3	4,5	0,0	+0,0%	●
M-19-00043	Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Kemmannstr. / Neubau einer Rettungswache	4,1	0,0	4,1	0,5	4,1	0,0	-0,5%	●
M-18-00030	Werkstatt, Giebel 46 / Abriss und Neubau Betriebshof	19,5	4,9	24,4	24,6	24,8	-0,4	-1,4%	●
Summe		375,7	68,7	444,3	424,3	434,1	10,2		

- IST <= Beschluss
- IST > Beschluss & Abweichung < 105 TEUR
- IST > Beschluss & Abweichung > 105 TEUR

Reporting Q2/2024

Erläuterung der 10 größten absoluten Abweichungen der Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss in Mio. EUR

M-ID & Beschreibung	Abweichung	Erläuterung	Chance / Risiko
M-15-00088 Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 Gesamtsanierung	5,7	Zeitliche Verzögerung durch erneute Ausschreibung Konkretisierung der Kosten nach LP3 (Kostenberechnung) Wechsel der Zuständigkeiten Mehrkosten durch Änderung der Ausführung	Mögliche weitere Verzögerung aufgrund der ungewissen Genehmigungsphase. Bisher wenig Ausschreibungsergebnisse. Die Maßnahme befindet sich am Anfang.
M-15-00075 Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	2,2	Mehrkosten bei diversen Gewerken Zeitliche Verzögerung bei der Ausführung Mehrkosten durch Kundenwunsch und Honoraranpassung Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Höhere Ausführungs- und Planungskosten	-
M-20-00090 Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Straße 4 Sanierung der Bühnentechnik, Podien, Punktzüge	1,5	Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Zeitliche Verzögerung bei der Ausführung	Die Aufträge sind weitestgehend vergeben. Arbeiten sind nur während den Spielzeitpausen möglich.
M-16-00080 Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße Neubau C-Trakt_Gesamtsanierung K-Trakt	-1,1	Entfall vom Index, größter Teil bereits ausgeschrieben	Ausschreibungen für das fest eingebaute Inventar ausstehend (finanziert durch Kundenmittel).
M-16-00072 GGS Gewerbeschulstraße Neubau OGGs	1,1	Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Zeitliche Verzögerung durch Änderung der Planung	-
M-20-00064 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg	0,8	Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Mehrkosten durch unvorhersehbare Ereignisse	-
M-16-00106 Historisches Zentrum Wuppertal, Engelsstraße 10 Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum	0,6	Zeitliche Verzögerung durch unvorhersehbare Ereignisse	-
M-18-00010 Engels-Haus, Engelsstraße 10 Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption	-0,4 /		Risiko einer Durchfeuchtung des Mauerwerks aufgrund der Regenfälle.
M-18-00030 Werkstatt, Giebel 46 Abriss und Neubau Betriebshof	-0,4	Neue Kosten- und Indexberechnung	-
M-14-00167 Gemeinschaftsgrundschule Haselrain Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	0,3	Mehrkosten bei den Außenanlagen	-
10,3			

Reporting Q2/2024

Prognose der Leistungsphase und Stand der Kostenermittlung zum 31.12.2024 aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss (1/2)

M-ID & Beschreibung	Leistungsphase nach HOAI		Stand der Kostenermittlung nach DIN 276		
	WiPI 2024	akt. Prognose	WiPI 2024	akt. Prognose	
M-14-00072 Barmen Grundschule Peterstraße / Gesamtsanierung	101 : Grundschulen	LP9	LP9	5	5
M-16-00072 Barmen GGG Gewerbeschulstraße / Neubau OGGG	101 : Grundschulen	LP5	LP5	3	3
M-14-00167 Oberbarmen Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	101 : Grundschulen	LP9	LP9	5	5
M-16-00119 Uellendahl-Katernberg Grundschule Hainstraße / Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	101 : Grundschulen	LP8	LP8	5	4
M-17-00052 Langerfeld-Beyenburg Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstraße 6 / Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	102 : Hauptschulen	LP9	LP9	5	5
M-15-00088 Barmen Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtsanierung	103 : Realschulen	LP4	LP4	3	3
M-15-00075 Vohwinkel Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	103 : Realschulen	LP3	LP5	-	3
M-15-00115 Barmen Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtsanierung	104 : Gymnasien	LP4	LP4	-	3
M-20-00064 Barmen Ganztagsgymnasium Johannes-Rau / Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg	104 : Gymnasien	LP8	LP8	4	4
M-16-00080 Elberfeld-West Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt_Gesamtsanierung K-Trakt	104 : Gymnasien	LP8	LP8	4	4
M-16-00075 Oberbarmen Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtsanierung und Erweiterung	106 : Förderschulen	LP8	LP8	4	4

Stand der Kostenermittlung nach DIN 276

- 1 Kostenrahmen
- 2 Kostenschätzung
- 3 Kostenberechnung
- 4 Kostenanschlag
- 5 Kostenfeststellung

Leistungsphasen nach HOAI

- LP1 Grundlagenermittlung
- LP2 Vorplanung
- LP3 Entwurfsplanung
- LP4 Genehmigungsplanung
- LP5 Ausführungsplanung
- LP6 Vorbereitung der Vergabe
- LP7 Mitwirkung bei der Vergabe
- LP8 Objektüberwachung
- LP9 Objektbetreuung

Reporting Q2/2024

Prognose der Leistungsphase und Stand der Kostenermittlung zum 31.12.2024 aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss (2/2)

M-ID & Beschreibung	Leistungsphase nach HOAI		Stand der Kostenermittlung nach DIN 276	
	WiPI 2024	akt. Prognose	WiPI 2024	akt. Prognose
M-13-00036 Langerfeld-Beyenburg 107 : Gesamtschulen Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	LP3	LP5	-	3
M-20-00082 Langerfeld-Beyenburg 201 : Kindertagesstätten Städtische Kindertagesstätte, Leibuschstraße 37 / Neubau einer 4 gruppigen TfK	-	-	-	-
M-16-00033 Oberbarmen 201 : Kindertagesstätten Städtische Kindertagesstätte, Grafenstraße 11 / Neubau einer 6 gruppigen TfK	-	-	-	-
M-16-00125 Oberbarmen 301 : Bäder Freibad Mählersbeck / Abriss und Neubau des Freibades	LP7	LP8	4	4
M-16-00106 Barmen 304 : Historisches Zentrum Historisches Zentrum Wuppertal, Engelsstraße 10 / Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum	LP9	LP9	5	5
M-18-00010 Barmen 304 : Historisches Zentrum Engels-Haus, Engelsstraße 10 / Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption	LP9	LP9	5	5
M-20-00090 Barmen 307 : Opernhaus Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Straße 4 / Sanierung der Bühnentechnik, Podien, Punktzüge	LP8	LP8	4	4
M-14-00103 Uellendahl-Katernberg 308 : Sportplatzhäuser und Sporthallen Turnhalle Hardenberg / Neubau Turnhalle und Vereinsheim	LP9	LP9	5	5
M-19-00043 Cronenberg 404 : Vermietung an Feuerwehr Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Kemmannstr. / Neubau einer Rettungswache	LP9	LP9	5	5
M-18-00030 Elberfeld-West 405 : Vermietung an 103 Werkstatt, Giebel 46 / Abriss und Neubau Betriebshof	LP5	LP5	4	3

Stand der Kostenermittlung nach DIN 276

- 1 Kostenrahmen
- 2 Kostenschätzung
- 3 Kostenberechnung
- 4 Kostenanschlag
- 5 Kostenfeststellung

Leistungsphasen nach HOAI

- LP1 Grundlagenermittlung
- LP2 Vorplanung
- LP3 Entwurfsplanung
- LP4 Genehmigungsplanung
- LP5 Ausführungsplanung
- LP6 Vorbereitung der Vergabe
- LP7 Mitwirkung bei der Vergabe
- LP8 Objektüberwachung
- LP9 Objektbetreuung

Reporting Q2/2024

Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen ohne Beschluss und mit Grundsatzbeschluss in Mio. EUR

Maßnahmen ohne Beschluss


M-ID & Beschreibung	Bezirk	Gruppierung
M-21-00044 Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Elfenhang 4-6 / Umbau zur Dep. einer Förderschule	Vohwinkel	101 : Grundschulen
M-21-00069 Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, Johannisberg 20 / G-9-Erweiterung	Elberfeld	104 : Gymnasien
M-21-00045 Ausweichgebäude - Gymnasium Bayreuther Straße, Hufschmiedstr. 5 / Wiederherstellung zur Förderschule	Elberfeld	106 : Förderschulen
M-23-00052 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / 7. Gesamtschule - Interim	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenburg	107 : Gesamtschulen
ohne Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreisentwicklung / Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreiserhöhung	keine Bezirkszuordnung	317 : Sonstiges
Summe		36,5

Maßnahmen mit Grundsatzbeschluss

M-ID & Beschreibung	Bezirk	Gruppierung
M-17-00070 Helene-Stöcker-Förderschule, Eichenstraße 59 / Sanierung und Umbau zur Grundschule	Barmen	101 : Grundschulen
M-17-00110 Städt. Offene Gemeinschaftsgrundschule Matthäusstraße, Rathenaustr. 22 / Gesamtanierung und Umbau für Grundschule inkl. Neubau Turnhalle	Oberbarmen	101 : Grundschulen
M-19-00021 Berufskolleg am Haspel, Schluchtstraße 30 / Gesamtanierung und Umbau	Barmen	105 : Berufskollegs
M-18-00101 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / Errichtung 7. Gesamtschule	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenburg	107 : Gesamtschulen
M-14-00062 Schauspielhaus Bundesallee / Pina Bausch Zentrum	Elberfeld	306 : Schauspielhaus
M-19-00036 Rettungswache, Mauerstraße / Neubau einer Rettungswache	Barmen	404 : Vermietung an Feuerwehr
M-19-00045 Rettungswache Ronsdorf, Otto-Hahn-Straße / Neubau einer Rettungswache	Ronsdorf	404 : Vermietung an Feuerwehr
M-19-00003 Rettungswache Vohwinkel / Neubau einer Rettungswache	Vohwinkel	404 : Vermietung an Feuerwehr
Summe		482,5

Reporting Q2/2024

Zur Verfügung stehende Mittel gegenüber Leistungsprognose per Q2/2024 in Mio. EUR

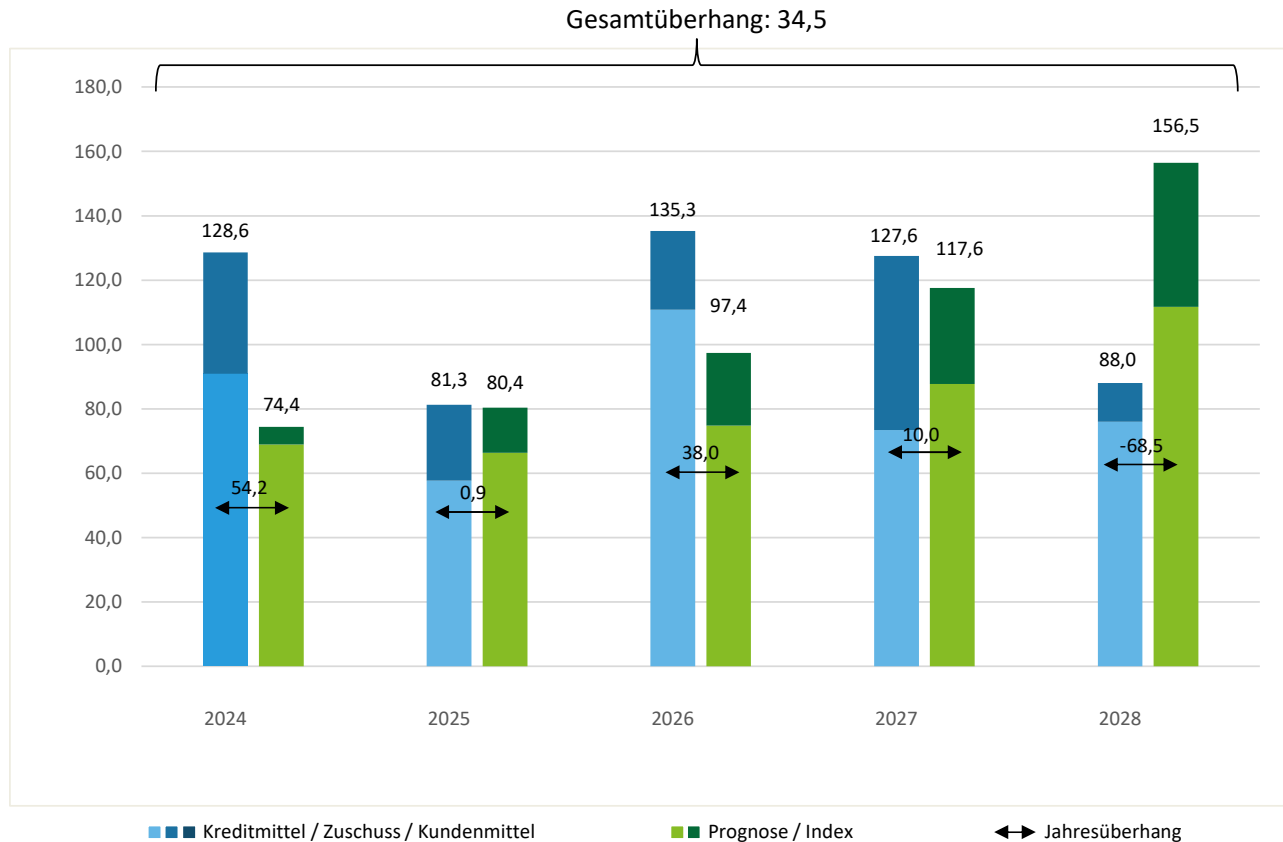

Der Abgleich der verfügbaren Gesamtmittel zur Leistungsprognose zeigt bis zum Jahr 2028 einen Überhang in Höhe von 34,5 Mio. EUR.

Gesamtmittel vs. Leistungsprognose


Q2/2024	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtmittel	128,6	81,3	135,3	127,6	88,0
Kreditmittel	90,9	57,7	110,8	73,4	76,0
Zuschuss	37,6	23,6	24,5	54,1	12,0
Kundenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsprognose	74,4	80,4	97,4	117,6	156,5
Prognose	69,0	66,3	74,8	87,8	111,7
Index	5,4	14,1	22,6	29,8	44,7
Überhang	54,2	0,9	38,0	10,0	-68,5
Bewertung	●	●	●	●	●

- Gesamtmittel > Leistungsprognose
- Gesamtmittel < Leistungsprognose, kum. Überhang > 0
- Gesamtmittel < Leistungsprognose, kum. Überhang < 0


Reporting Q2/2024

Aktueller Auszahlungsstand gegenüber geplanten Auszahlungen 2024 laut Wirtschaftsplan in Mio. EUR

Gesamtauszahlungen 2024 laut WiPI

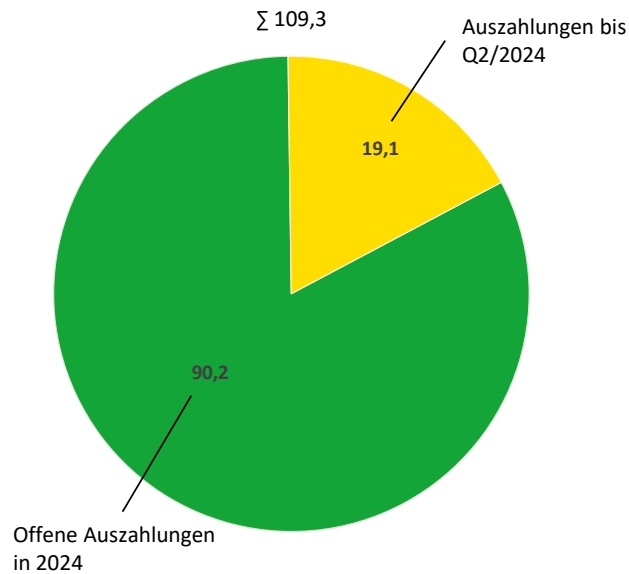

Top 5 Maßnahmen mit >50%* tatsächlicher Auszahlung

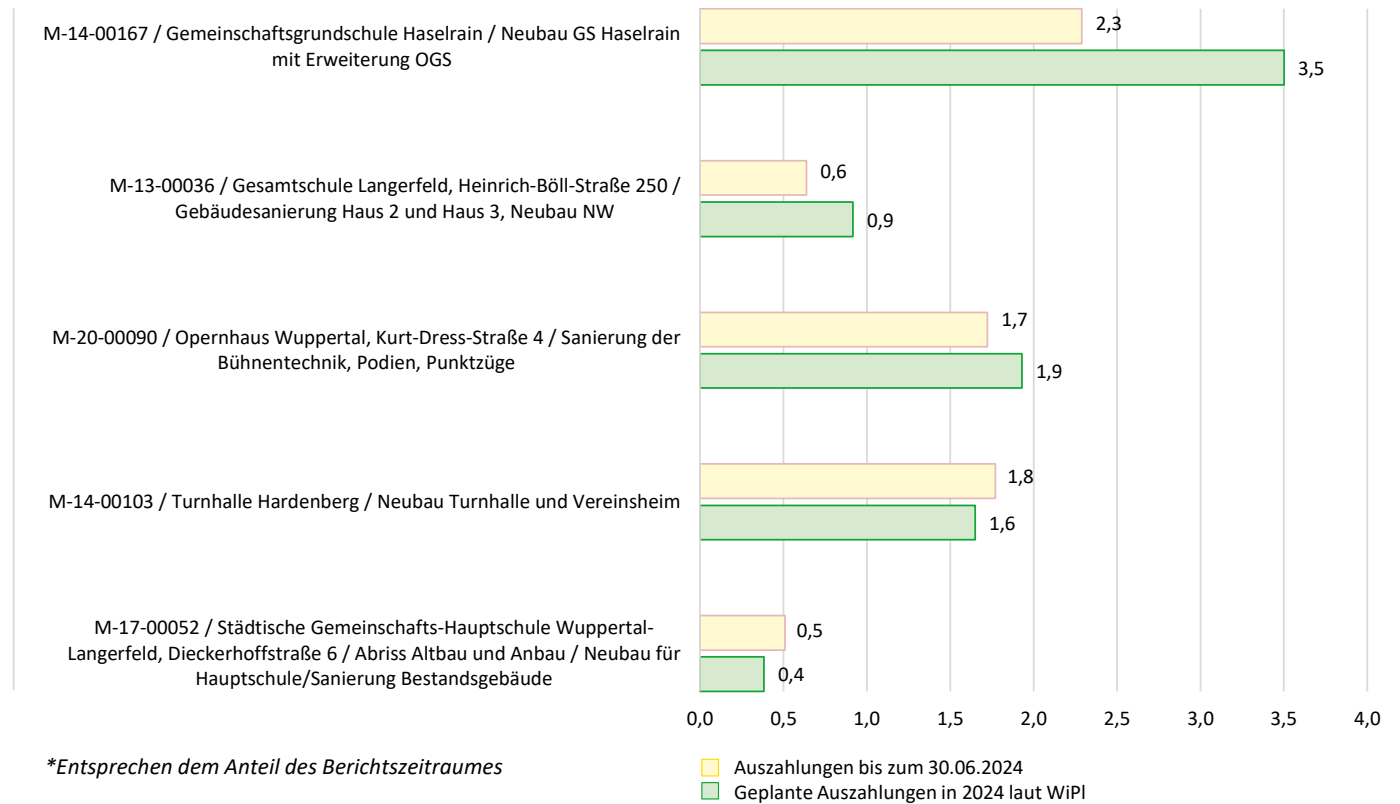



Ausblick

GMW
INVESTITIONSCONTROLLING



Ausblick

Geplante Fertigstellungen in 2024

M-ID & Beschreibung			Geplanter Termin
M-14-00167	Oberbarmen	101 : Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	Q3/2024
M-18-00010	Barmen	304 : Historisches Zentrum Engels-Haus, Engelsstraße 10 / Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption	Q3/2024
M-16-00125	Oberbarmen	301 : Bäder Freibad Mählersbeck / Abriss und Neubau des Freibades	Q4/2024

Geplante Beschlussfassungen in 2024

M-ID & Beschreibung			Geplante Beschlussart
M-14-00167	Oberbarmen	101 : Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	Mehrkostenbeschluss
M-18-00101	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenburg	107 : Gesamtschulen 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / Errichtung 7. Gesamtschule	Durchführungsbeschluss im TU-Verfahren
M-19-00021	Barmen	105 : Berufskollegs Berufskolleg am Haspel, Schluchtstraße 30 / Gesamtanierung und Umbau	Neuer Grundsatzbeschluss



Glossar

GMW
INVESTITIONSCONTROLLING



Abkürzungsverzeichnis

- akt. aktuell
- aufgr. aufgrund
- Dep. Dependance
- GGS Gemeinschaftsgrundschule
- ggü. gegenüber
- GS Grundschule
- HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- inkl. inklusive
- kum. kumuliert
- LP Leistungsphase
- M-ID Maßnahmen-Identifikation
- NW Naturwissenschaften
- OGGS Offene Gemeinschaftsgrundschule
- OGS Offene Ganztagschule
- TfK Tageseinrichtung für Kinder
- TU Totalunternehmer
- u. und
- VO Beschlussvorlage
- WiPI Wirtschaftsplan
- zw. zwischen
