



BERICHT Q1/2026

Wuppertal, den 01.06.2026



Inhaltsverzeichnis

Bericht Q1/2026

• Zusammenfassung	3
• Neue Beschlüsse und Fertigstellungen	4
• Anzahl und Investitionen der Maßnahmen nach Produktbereich	5
• Anzahl und Investitionen der Maßnahmen nach aktueller Beschlusslage	6
• Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss	7
• Übersicht über die Prognose und Indexierung aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss	8
• Erläuterung der 10 größten absoluten Abweichungen der Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss	9
• Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen ohne Beschluss	10
• Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Grundsatzbeschluss	12
• Zur Verfügung stehende Mittel gegenüber geplanter Auszahlung	13

Ausblick	14
-----------------	-----------

Glossar	16
----------------	-----------

• Abkürzungsverzeichnis	17
-------------------------	----

Bericht Q1/2026

Zusammenfassung

- Ab dem Berichtsjahr 2026 wird der Investitionscontrollingbericht auf Basis des Wirtschaftsplans 2026, inklusiv der aktualisierten Indexberechnung, aufgebaut.
- Zur Vergleichbarkeit werden die Vorquartalswerte ebenfalls mit der aktualisierten Indexberechnung berechnet.
- Die Maßnahmennummer für die Maßnahme „Offene Gemeinschaftsgrundschule Meyerstraße / Umbau im Schulgebäude zur Sicherstellung OGS“ (M-26-00004) wurde aktualisiert.
- Im Vergleich zum Vorquartal steigen die Investitionen für Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss um 8,1 Mio. EUR. Davon beruhen etwa 2,6 Mio. EUR auf der theoretischen Kostensteigerung (Indexberechnung).
- Die Finanzierung ist im Zeitraum von 2026 bis 2030 mit einer Unterdeckung von 16,4 Mio. EUR nicht gedeckt.

Basis: Genehmigtes Investitionsprogramm gemäß Wirtschaftsplan 2026

Bericht Q1/2026

Neue Beschlüsse und Fertigstellungen

Neue Beschlussfassungen

M-ID & Beschreibung			Beschlussart und Drs.Nr. VO	
M-21-00069	Elberfeld Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, Johannisberg 20 / G-9-Erweiterung	104 : Gymnasien	Grundsatzbeschluss VO/1152/25	Am 23.02.2026 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen.
M-24-00067	Uellendahl-Katernberg Gemeinschaftsgrundschule Am Dönberg / OGS-Ausbau	101 : Grundschulen	Durchführungsbeschluss VO/1171/26	Am 23.02.2026 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen.
M-25-00009	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenb. Grundschule Hammesberg / OGS-Ausbau, Erweiterungsbau	101 : Grundschulen	Durchführungsbeschluss VO/0021/26	Am 23.02.2026 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen.
M-25-00071	Elberfeld-West Anne-Frank-Förderschule, Kyffhäuser Straße 100 / Umbau vom Schulgebäude: Nutzung durch Förderschule, Förderschwerpunkt: Geistige Entwicklung	106 : Förderschulen	Durchführungsbeschluss VO/1153/25/1-Erg.	Am 23.02.2026 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen.


Fertiggestellte Maßnahmen

M-ID & Beschreibung
Keine Fertigstellungen in Q1/2026.


Bericht Q1/2026

Anzahl und Investitionen der Maßnahmen nach Produktbereich in Mio. EUR

Anzahl

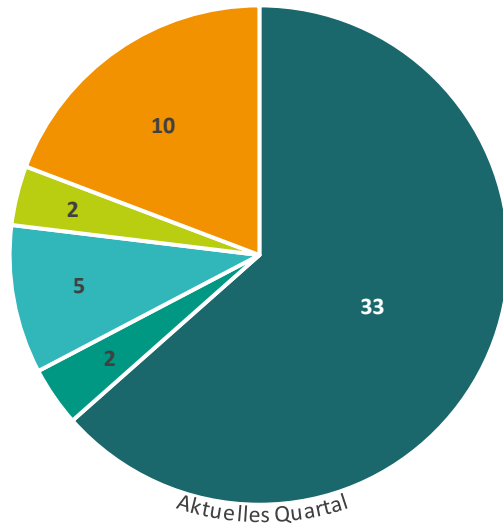

Investitionen

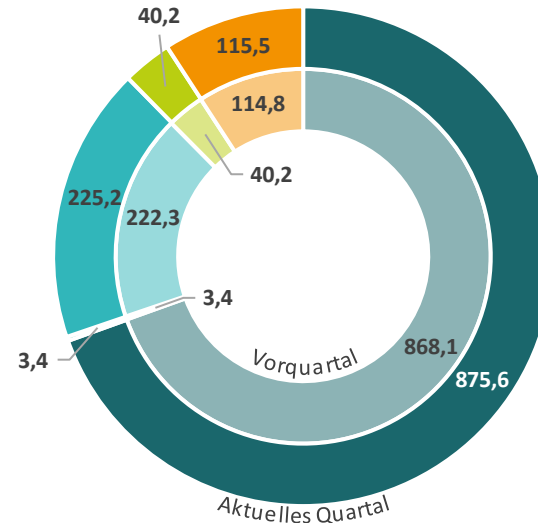


Änderungen

- Schulen:
+7,5 Mio. EUR (+0,9%)
- Soziale Einrichtungen:
+0,0 Mio. EUR (+0,0%)
- Kultur und Sport:
+3,0 Mio. EUR (+1,3%)
- Sonstiges:
+0,0 Mio. EUR (+0,0%)
- Verwaltungsgebäude, Schutz & Ordnung
+0,7 Mio. EUR (+0,6%)


Bericht Q1/2026

Anzahl und Investitionen der Maßnahmen nach aktueller Beschlusslage in Mio. EUR

Anzahl

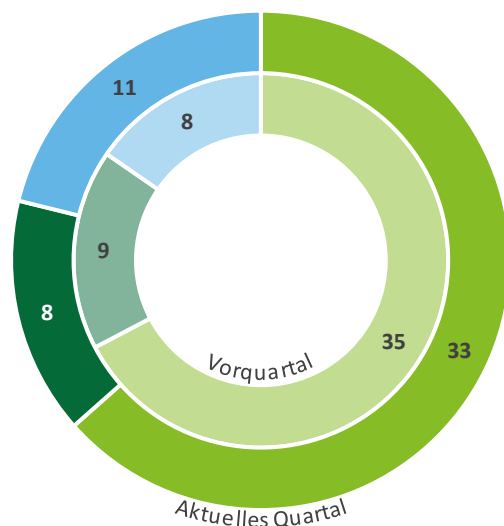

Investitionen

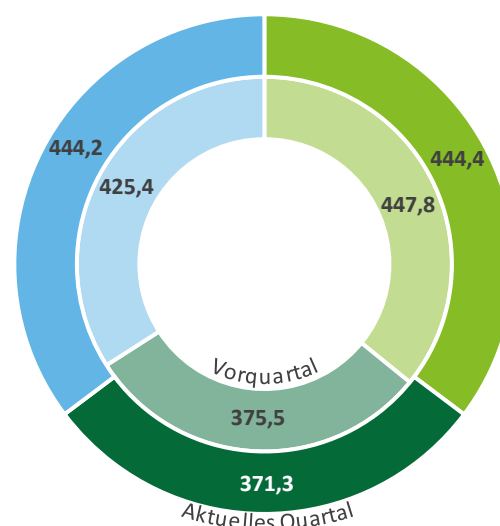

Änderungen

Beschlussstand:

- Ein weiterer Grundsatzbeschluss
- Drei weitere Durchführungsbeschlüsse

Investitionen der Maßnahmen nach Beschlusslage:

- Maßnahmen ohne Beschluss:
-3,4 Mio. EUR (-0,8%)
- Maßnahmen mit Grundsatzbeschluss:
-4,2 Mio. EUR (-1,1%)
- Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss:
+18,8 Mio. EUR (+4,4%)

Gesamtinvestitionen

Quartal: 1.259,9 Mio. EUR

Vorquartal: 1.248,8 Mio. EUR

+11,2 Mio. EUR (+0,9%)

Bericht Q1/2026

Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss

M-ID & Beschreibung	Gruppierung & Bezirk	Drs.Nr. VO	LP	Fertigstellungstermin		Innuzung- nahme	
				Q4/2025	Q1/2026		
M-16-00072 Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße Neubau OGGS	101 : Grundschulen Barmen	VO/1004/22	8	Q3/2028	Q3/2028	-	●
M-17-00070 ehemal. Helene-Stöcker-Förderschule, Eichenstraße 59 Neubau OGS mit Einfachturnhalle	101 : Grundschulen Barmen	VO/0392/25	GU	Q2/2029	Q2/2029	-	●
M-25-00009 Grundschule Hammesberg OGS-Ausbau, Erweiterungsbau	101 : Grundschulen Heckinghausen, Langerfeld-Beyenb.	VO/0021/26	5	-	Q4/2027	-	●
M-24-00067 Gemeinschaftsgrundschule Am Dönberg OGS-Ausbau	101 : Grundschulen Uellendahl-Katernberg	VO/1171/26	TU	-	Q4/2027	-	●
M-15-00088 Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 Gesamtsanierung	103 : Realschulen Barmen	VO/0140/23	5	Q2/2032	Q3/2032	-	●
M-15-00075 Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	103 : Realschulen Vohwinkel	VO/0059/23	5	Q3/2028	Q4/2029	-	●
M-15-00115 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 Gesamtsanierung	104 : Gymnasien Barmen	VO/0538/24 /1-Neuf.	5	Q1/2031	Q2/2031	-	●
M-25-00071 Anne-Frank-Förderschule, Kyffhäuser Straße 100 Umbau vom Schulgebäude: Nutzung durch Förderschule, Förderschwerpunkt: Geistige Entwicklung	106 : Förderschulen Elberfeld-West	VO/1153/25 /1-Erg.	8	-	Q3/2026	-	●
M-18-00101 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle Errichtung 7. Gesamtschule	107 : Gesamtschulen Heckinghausen, Langerfeld-Beyenb.	VO/0943/24	TU	Q3/2030	Q3/2030	-	●
M-13-00036 Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	107 : Gesamtschulen Langerfeld-Beyenburg	VO/0507/24 /1-Neuf.	5	Q2/2031	Q2/2031	-	●
M-18-00030 Werkstatt, Giebel 46 Abriss und Neubau Betriebshof	405 : Vermietung an 103 Elberfeld-West	VO/1456/22	7	Q4/2028	Q4/2028	-	●

GU Generalunternehmer

TU Totalunternehmer

Bericht Q1/2026

Übersicht über die Prognose und Indexierung aller Maßn. mit Durchführungsbeschluss in Mio. EUR

M-ID & Beschreibung	Q4/2025	Q1/2026	Änderung zum Vorquartal						Beschluss		
			Abw.	Prognose	Index				Ist	Abw.	
M-16-00072 Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße / Neubau OGGS	17,9	17,9	+0,0	+0,0		+0,0			15,4	+2,5	+16,3% ●
M-17-00070 ehemal. Helene-Stöcker-Förderschule, Eichenstraße 59 / Neubau OGS mit Einfachturnhalle	22,2	22,2	+0,1	+0,1		+0,0			23,4 ²	-1,2	-5,0% ●
M-25-00009 Grundschule Hammesberg / OGS-Ausbau, Erweiterungsbau	2,9 ¹	4,1	+1,2	+1,0		+0,2			2,9	+1,2	+40,9% ●
M-24-00067 Gemeinschaftsgrundschule Am Dönberg / OGS-Ausbau	5,3 ¹	6,2	+0,9	+1,3		-0,3			5,3	+0,9	+17,6% ●
M-15-00088 Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtsanierung	52,3	52,4	+0,1	+0,1		+0,0			53,3	-0,9	-1,7% ●
M-15-00075 Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	41,5	45,3	+3,7	+2,1		+1,7			32,9	+12,4	+37,6% ●
M-15-00115 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtsanierung	72,9	73,8	+0,9	0,0		+0,9			70,6 ²	+3,3	+4,6% ●
M-25-00071 Anne-Frank-Förderschule, Kyffhäuser Straße 100 / Umbau vom Schulgebäude: Nutzung durch Förderschule, Förderschwerpunkt: Geistige Entwicklung	2,5 ¹	2,9	+0,4	+0,4		0,0			2,5	+0,4	+17,6% ●
M-18-00101 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / Errichtung 7. Gesamtschule	132,9	132,9	0,0	0,0		0,0			140,3 ²	-7,4	-5,3% ●
M-13-00036 Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	59,9	59,9	0,0	0,0		0,0			63,1 ²	-3,2	-5,1% ●
M-18-00030 Werkstatt, Giebel 46 / Abriss und Neubau Betriebshof	25,8	26,5	+0,7	+0,6		+0,1			24,8	+1,7	+7,0% ●
Summe	436,1	444,2	+8,1	+5,6		+2,6			434,5	+9,7	

¹ Für Maßnahmen, die ab 2026 zusätzlich ins Investitionsprogramm aufgenommen wurden, werden für das Vorquartal die Werte des Wirtschaftsplans 2026 verwendet.

² Reduzierung der Beschlusshöhe um schulische Ausstattung (loses Inventar), da keine Umsetzung durch GMW.

Anmerkung: Über alle Maßnahmen, für die aktuell ein Durchführungsbeschluss vorliegt, kann im Detail berichtet werden, da mit dem Durchführungsbeschluss eine valide Kostenberechnung vorhanden ist (ab Leistungsphase 3). Zudem ist die Kostenerhöhung durch die Fortschreibung der Indizierung berücksichtigt.

Bericht Q1/2026

Erläuterung der 10 größten absoluten Abweichungen der Maßn. mit Durchführungsbeschluss in Mio. EUR

M-ID & Beschreibung	Q1/2026	Beschluss	Abweichung	Erläuterung
M-15-00075 Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	45,3	32,9	+12,4	Mehrkosten bei diversen Gewerken Zeitliche Verzögerung bei der Ausführung Mehrkosten durch Honoraranpassung Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Höhere Ausführungs- und Planungskosten
M-18-00101 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle Errichtung 7. Gesamtschule	132,9	140,3	-7,4	Indexberechnung laut Wirtschaftsplan 2026
M-15-00115 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 Gesamtsanierung	73,8	70,6	+3,3	Verzögerung in der Planung Zeitliche Verzögerung bei der Ausführung Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Unvorhersehbare Ereignisse
M-13-00036 Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	59,9	63,1	-3,2	Indexberechnung laut Wirtschaftsplan 2026
M-16-00072 Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße Neubau OGS	17,9	15,4	+2,5	Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Zeitliche Verzögerung durch Änderung der Planung Wechsel der Zuständigkeiten (extern) Mehrkosten bei diversen Gewerken
M-18-00030 Werkstatt, Giebel 46 Abriss und Neubau Betriebshof	26,5	24,8	+1,7	Mehrkosten bei diversen Gewerken
M-17-00070 ehemal. Helene-Stöcker-Förderschule, Eichenstraße 59 Neubau OGS mit Einfachturnhalle	22,2	23,4	-1,2	Indexberechnung laut Wirtschaftsplan 2026
M-25-00009 Grundschule Hammesberg OGS-Ausbau, Erweiterungsbau	4,1	2,9	+1,2	Detaillierte Kostenbetrachtung Höhere Ausführungs- und Planungskosten Mehrkosten durch zusätzliche Leistungen
M-24-00067 Gemeinschaftsgrundschule Am Dönberg OGS-Ausbau	6,2	5,3	+0,9	Höhere Submissionsergebnisse Mehrbedarf durch Kundenanforderung Mehrkosten aufgrund vertiefender Grundlagenermittlung
M-15-00088 Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 Gesamtsanierung	52,4	53,3	-0,9	Indexberechnung laut Wirtschaftsplan 2026
	441,3	432,0	+9,3	

Bericht Q1/2026

Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen ohne Beschluss in Mio. EUR (1/2)

M-ID & Beschreibung		Bezirk	Gruppierung
M-24-00062	Gemeinschaftsgrundschule Marper Schulweg / Anbau von Mensa und Schulraumerweiterung um 0,5 Züge	Barmen	101 : Grundschulen
M-24-00068	Städt. Gemeinschaftsgrundschule Rudolfstraße / OGS Erweiterung über Mensamodul	Barmen	101 : Grundschulen
M-16-00065	Gemeinschaftsgrundschule Sillerstraße / Gesamtsanierung, ggf. Erweiterung um 1 Zug	Elberfeld-West	101 : Grundschulen
M-26-00004	Offene Gemeinschaftsgrundschule Meyerstraße / Umbau im Schulgebäude zur Sicherstellung OGS	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenb.	101 : Grundschulen
N.N.#5	- / Erweiterung von Grundschulen um 12 Züge	keine Bezirkszuordnung	101 : Grundschulen
M-23-00052	Grundschule Klippe / Neubau Grundschule	Langerfeld-Beyenburg	101 : Grundschulen
M-25-00096	Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Abbruch des Altbaus	Oberbarmen	101 : Grundschulen
M-16-00060	Gemeinschaftsgrundschule Echoer Str. / Gesamtsanierung	Ronsdorf	101 : Grundschulen
M-24-00066	Gemeinschaftsgrundschule Engelbert-Wüster-Weg / Erweiterung der Zügigkeit und der OGS	Ronsdorf	101 : Grundschulen
M-25-00104	Grundschule Hainstraße / Neubau einer Turnhalle	Uellendahl-Katernberg	101 : Grundschulen
M-24-00065	Städt. Gemeinschaftsgrundschule Distelbeck / OGS-Ausbau	Elberfeld	101a : Grundschulen OGS-Ausbau
M-25-00059	Schulzentrum Süd, Jung-Stilling-Weg 45 / Schulraumerweiterung für die Friedrich-Bayer-Realschule	Cronenberg	104 : Gymnasien
M-23-00049	Berufskolleg Am Haspel, Außenstelle, Ritterstr. 54 / Umbau zu einer GS	Barmen	105 : Berufskollegs
M-20-00095	Berufskolleg Werther Brücke, Gewerbeschulstraße 34 / Sanierung der Dächer Shedhalle	Heckinghausen	105 : Berufskollegs
M-21-00045	Hufschmiedstr. 5 / Wiederherstellung zur Förderschule	Elberfeld	106 : Förderschulen
M-16-00070	Gesamtschule Else-Lasker-Schüler / Gesamtsanierung	Elberfeld	107 : Gesamtschulen
Zwischensumme			286,7

Bericht Q1/2026

Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen ohne Beschluss in Mio. EUR (2/2)

M-ID & Beschreibung		Bezirk	Gruppierung
Übertrag Zwischensumme			286,7
M-23-00054	7. städtische Gesamtschule / 7. Gesamtschule - 4-Fach-Sporthalle	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenb.	107 : Gesamtschulen
M-24-00076	- / Investorenverfahren - weiterführ. Schule im Osten Wuppertals	keine Bezirkszuordnung	107 : Gesamtschulen
M-21-00048	Erich-Fried-Gesamtschule Ronsdorf, An der Blutfinke 70/74 / Sanierung und Modernisierung (Sanitär, Fenster, Fassade, Dämmung, Heizung)	Ronsdorf	107 : Gesamtschulen
M-25-00037	Pina-Bausch-Gesamtschule, Werderstraße 61 / Schulraumerweiterung Pina-Bausch-Gesamtschule	Vohwinkel	107 : Gesamtschulen
M-24-00096	Erweiterung - Die Färberei, Peter-Hansen-Platz 1 / Ankauf Gebäude für Erweiterung der Färberei	Oberbarmen	219 : Sonstiges 2
M-25-00016	Erweiterung - Die Färberei, Peter-Hansen-Platz 1 / Umbau und Aufstockung zur Erweiterung der Färberei	Oberbarmen	219 : Sonstiges 2
M-22-00062	Gartenhallenbad, Am Timpen 51 / Umfassende Sanierung Gartenhallenbad	Langerfeld-Beyenburg	301 : Bäder
M-25-00008	Stadtbad Uellendahl, Röttgen 149 / Sanierung, Hallenbad Uellendahl	Uellendahl-Katernberg	301 : Bäder
M-25-00062¹	Historische Stadthalle, Johannisberg 40 / Sanierung Stadthallenfassade	Elberfeld	305 : Stadthalle
M-23-00055	3-fach Sporthalle, Yorckstraße 28 / Neubau einer 3-fach-Sporthalle	Vohwinkel	308 : Sportplatzhäuser und Sporthallen
M-24-00045	Rathaus Barmen, Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 / Herrichtung EG der ehemaligen WMF-Flächen	Barmen	401 : Vermietung von Verwaltungsgebäuden
M-24-00048	Rathaus Barmen, Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 / Begleitung Umsetzung Flächenkonsolidierung nach Umzug der LE in die Bundesbahndirektion	Barmen	401 : Vermietung von Verwaltungsgebäuden
M-25-00050	Verwaltungsgebäude, Neumarkt 10 / Modernisierung/Sanierung im Rahmen des Projektes „Flächenstrategie“	Elberfeld	401 : Vermietung von Verwaltungsgebäuden
M-25-00058	Verwaltungsgebäude, Willy-Brandt-Platz / Umbau Gesundheitsamt nach Nutzerbedarf	Elberfeld	401 : Vermietung von Verwaltungsgebäuden
(M-18-00030)	Betriebshof, Giebel 46 / Ersatzneubau Betriebshof Giebel - 2. Bauabschnitt	Elberfeld-West	405 : Vermietung an 103
N.N.#4	- / Kredite für Schlussrechnungen bereits baul. abgeschlossener Maßnahmen	keine Bezirkszuordnung	Sonstiges
N.N.#3	- / Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreiserhöhung	keine Bezirkszuordnung	Sonstiges
Summe			444,4

¹ Für den 1. Bauabschnitt der Sanierung der Stadthallenfassade liegt ein Durchführungsbeschluss (VO/1076/25) vor.

Bericht Q1/2026


Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Grundsatzbeschluss in Mio. EUR

M-ID & Beschreibung		Bezirk	Gruppierung
M-17-00110	Städt. Offene Gemeinschaftsgrundschule Matthäusstraße, Rathenastr. 22 / Gesamtanierung und Umbau für Grundschule inkl. Neubau Turnhalle	Oberbarmen	101 : Grundschulen
M-21-00069	Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, Johannisberg 20 / G-9-Erweiterung	Elberfeld	104 : Gymnasien
M-19-00021	Berufskolleg am Haspel, Schluchtstraße 30 / Gesamtanierung und Umbau	Barmen	105 : Berufskollegs
M-14-00062	Schauspielhaus / Pina Bausch Zentrum	Elberfeld	306 : Schauspielhaus
M-20-00080	Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Berghauser Str. 45 / Neubau Freiwillige Feuerwehr Cronenberg	Cronenberg	404 : Vermietung an Feuerwehr
M-19-00045	Rettungswache Ronsdorf, Otto-Hahn-Straße / Neubau einer Rettungswache	Ronsdorf	404 : Vermietung an Feuerwehr
M-24-00003	Feuerwehr Leitstelle, Westring / Neubau Leitstelle SG, W	Vohwinkel	404 : Vermietung an Feuerwehr
M-18-00031	Forstbetriebshof, Oberbergische Str. 70 A / Abbruch und Neubau Forstbetriebsgebäude	Barmen	405 : Vermietung an 103
Summe			371,3

Bericht Q1/2026

Zur Verfügung stehende Mittel gegenüber geplanter Auszahlung per Q1/2026 in Mio. EUR

Gesamtunterdeckung: 16,4

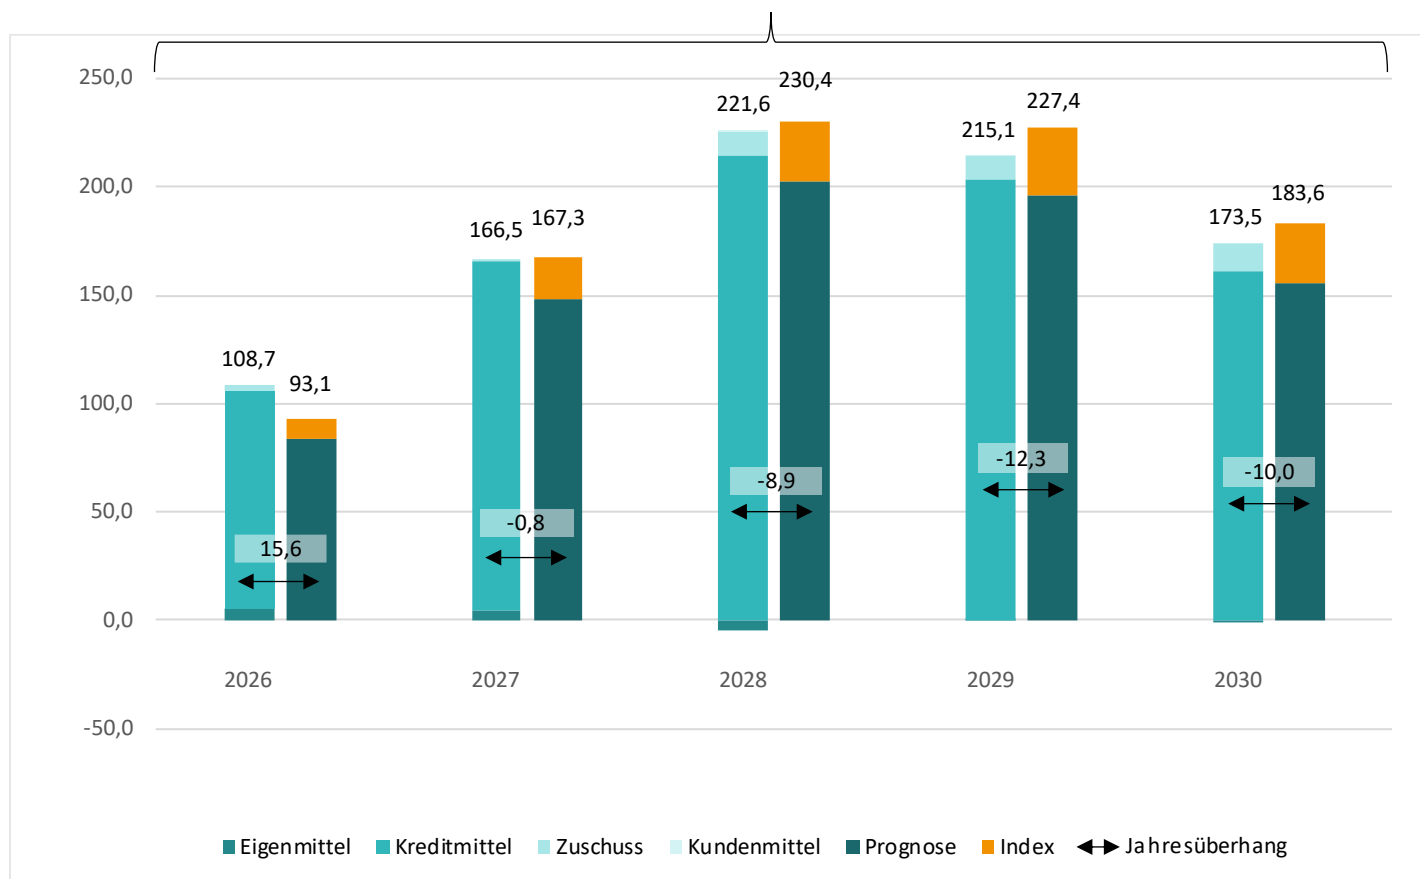

Der Abgleich der verfügbaren Gesamtmittel zur geplanten Auszahlung zeigt bis zum Jahr 2030 eine Unterdeckung in Höhe von 16,4 Mio. EUR.

Q1/2026	2026	2027	2028	2029	2030
Gesamtmittel	108,7	166,5	221,6	215,1	173,5
Eigenmittel	5,5	4,8	-4,9	0,2	-0,1
Kreditmittel	100,1	160,7	214,8	203,0	161,4
Zuschuss	3,2	0,9	11,3	11,9	12,2
Kundenmittel	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Leistungsprognose	93,1	167,3	230,4	227,4	183,6
Prognose	84,1	148,5	203,0	196,4	155,4
Index	9,1	18,7	27,5	30,9	28,2
Überhang	15,6	-0,8	-8,9	-12,3	-10,0
Bewertung	●	●	●	●	●

- Gesamtmittel > Leistungsprognose, kum. Überhang > 0
- Gesamtmittel < Leistungsprognose, kum. Überhang > 0
- kum. Überhang < 0



AUSBLICK



Ausblick

Geplante Fertigstellungen in 2026

M-ID & Beschreibung			Geplanter Termin
M-25-00071	Elberfeld-West	106 : Förderschulen	Q3/2026
Anne-Frank-Förderschule, Kyffhäuser Straße 100 / Umbau vom Schulgebäude: Nutzung durch Förderschule, Förderschwerpunkt: Geistige Entwicklung			

Geplante Beschlussfassungen

M-ID & Beschreibung			Geplante Beschlussart
M-17-00110	Oberbarmen	101 : Grundschulen	Neuer Grundsatzbeschluss
Städt. Offene Gemeinschaftsgrundschule Matthäusstraße, Rathenastr. 22 / Gesamtanierung und Umbau für Grundschule inkl. Neubau Turnhalle			
M-18-00031	Barmen	405 : Vermietung an 103	Neuer Grundsatzbeschluss
Forstbetriebshof, Oberbergische Str. 70 A / Abbruch und Neubau Forstbetriebsgebäude			
M-25-00008	Uellendahl-Katernberg	301 : Bäder	Grundsatzbeschluss & Durchführungsbeschluss
Stadtbad Uellendahl, Röttgen 149 / Sanierung, Hallenbad Uellendahl			
M-20-00080	Cronenberg	404 : Vermietung an Feuerwehr	Durchführungsbeschluss
Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Berghauser Str. 45 / Neubau Freiwillige Feuerwehr Cronenberg			
M-24-00067	Uellendahl-Katernberg	101 : Grundschulen	Mehrkostenbeschluss
Gemeinschaftsgrundschule Am Dönberg / OGS-Ausbau			
M-25-00009	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenb.	101 : Grundschulen	Mehrkostenbeschluss
Grundschule Hammesberg / OGS-Ausbau, Erweiterungsbau			
M-15-00075	Vohwinkel	103 : Realschulen	Mehrkostenbeschluss
Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude			
M-25-00071	Elberfeld-West	106 : Förderschulen	Mehrkostenbeschluss
Anne-Frank-Förderschule, Kyffhäuser Straße 100 / Umbau vom Schulgebäude: Nutzung durch Förderschule, Förderschwerpunkt: Geistige Entwicklung			

GLOSSAR

Abkürzungsverzeichnis

• Abw.	Abweichung
• Drs.Nr. VO	Drucksachen-Nummer Beschlussvorlage
• EG	Erdgeschoss
• Erg.	Ergänzend
• GS	Grundschule
• GU	Generalunternehmer
• kum.	kumuliert
• LE	Leistungseinheit
• LP	Leistungsphase
• Maßn.	Maßnahme
• M-ID	Maßnahmen-Identifikation
• Neuf.	Neufassung
• NW	Naturwissenschaften
• OGGS	Offene Gemeinschaftsgrundschule
• OGS	Offene Ganztagsschule
• TU	Totalunternehmer
