



Die Nordbahntrasse



**Ausschuss
für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen
am 18. September 2013
- TOP 2 -**




Rainer Widmann



Wegebau VohRang

- Länge ca. 1.190m
- Submission 09.09.2013
- Baubeginn Ende Oktober 2013
- Bauzeit ca. 1 Monat

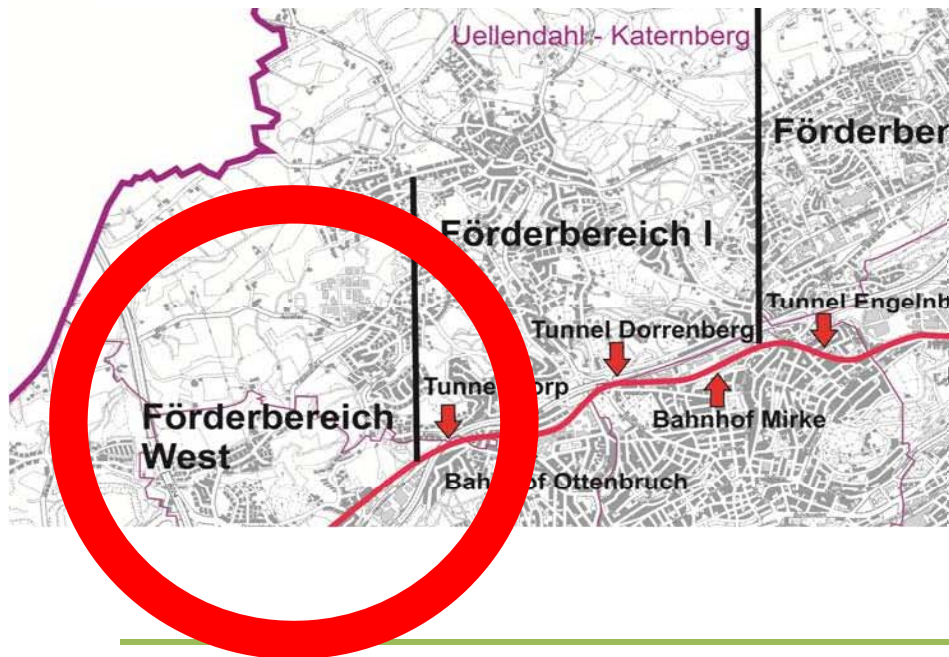




Wegebau West

Herderstraße (P&R-Vohwinkel)

- Länge ca. 440m
- Eröffnung Ende September 2013

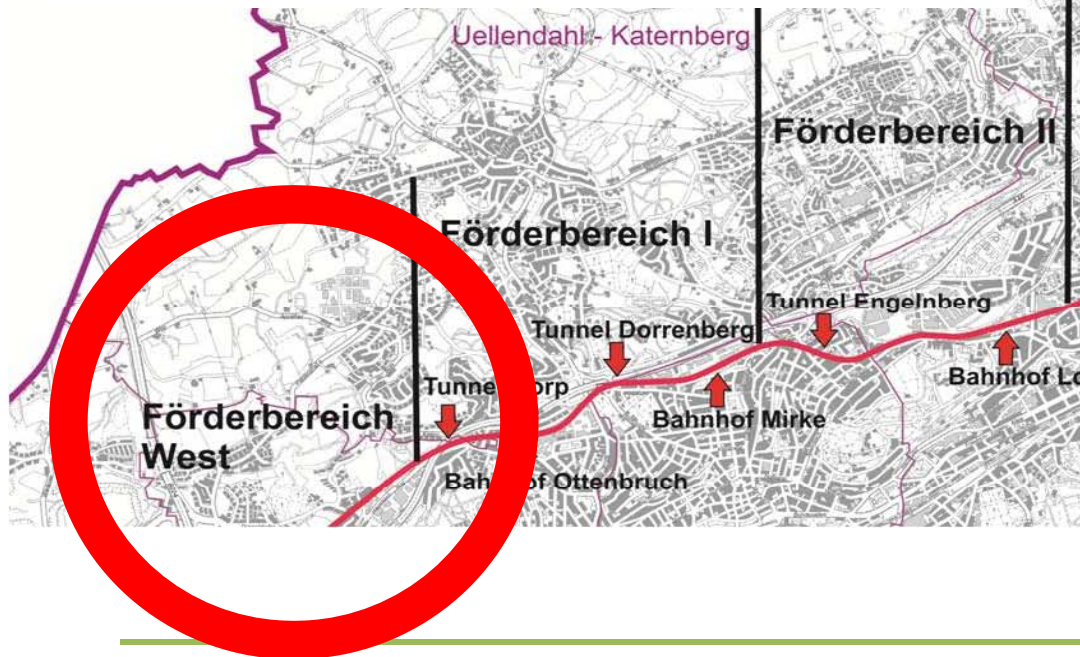



Wegebau West

Schutzgerüst im Tunnel Dorp


- ca. 12.000€ Spenden
- Eröffnung 9. August 2013





Tunnel Dorp

Licht an!

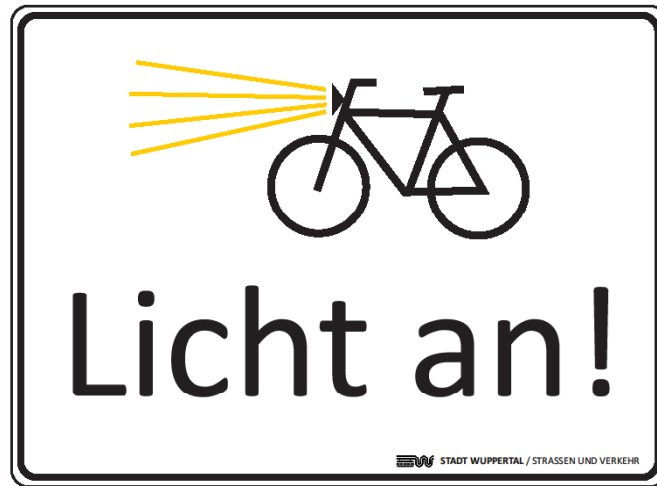



Trasse am Bf. Mirke





Wegebau Buchenstraße / Tunnel Rott / Hp. Rott



- Fristgerechte vor 30.09.2013
- 2. AM setzt innerhalb von 6 Wochen ca. 1.600m Randsteine und pflastert ca. 1.200m² Gehweg auf 540m Länge




Parcours Bf. Wichlinghausen



- ca. 1.000m² Trainingsanlage
- Kosten ca. 400.000€



Parcours Bf. Wichlinghausen

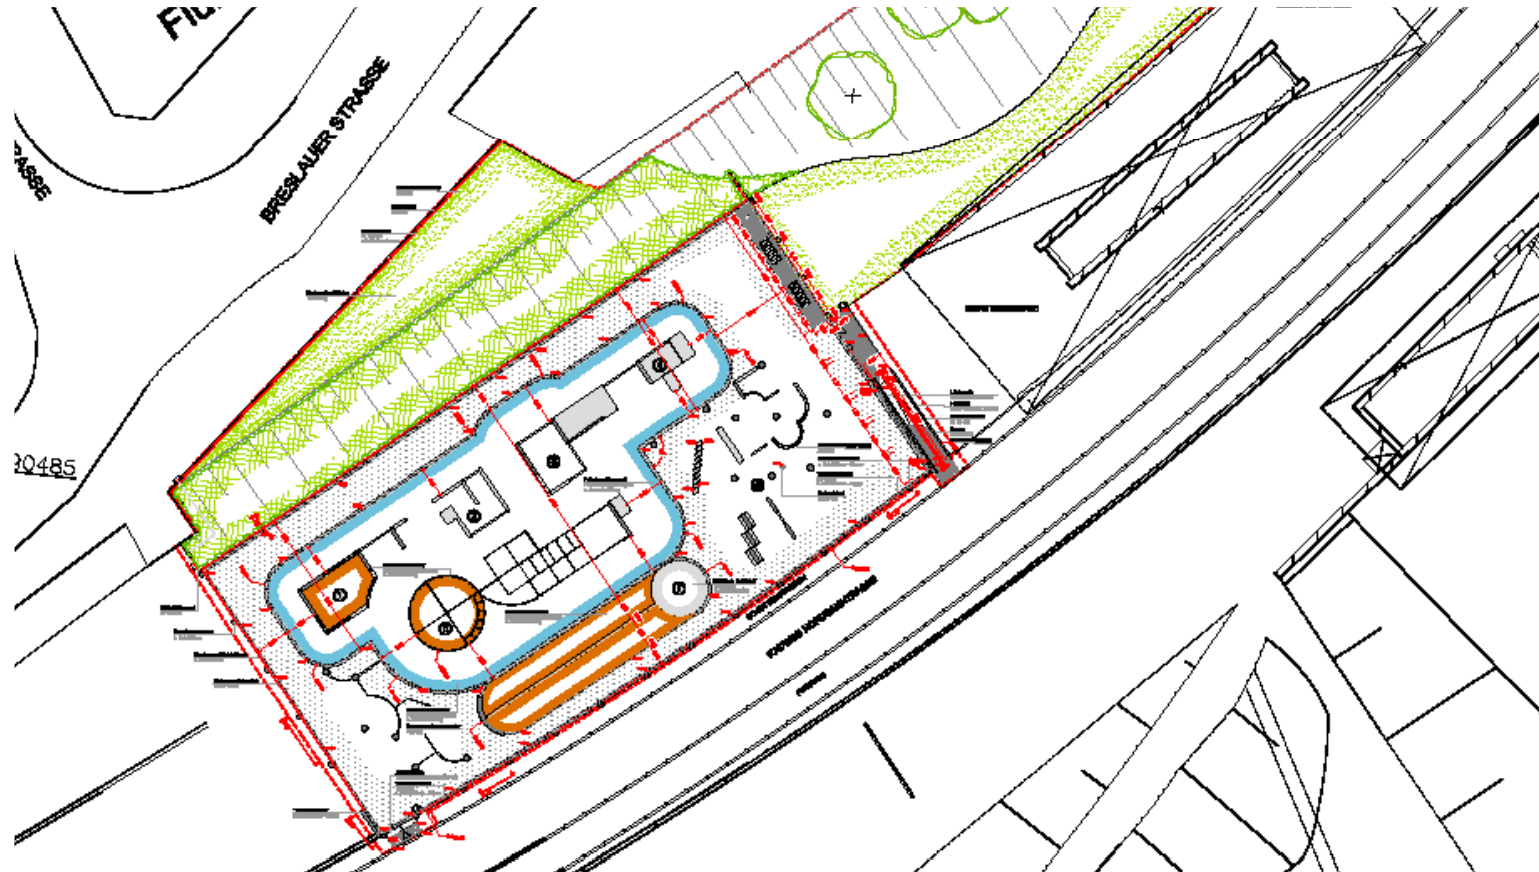

Schulzentrum
Ost



Bergisches Plateau






Bramdelle



- Felsberäumung abgeschlossen
- Submission Wegebau:
03.09.2013 – 7 Angebote
- Wegebau: ab Okt. / Nov. 2013
- Bauzeit: ca. 2 – 3 Monate
- Länge ca. 1.100m
- Anfang 2014: Bankette / Wälle /
Futterwandsanierung – 2. AM



Wegebau Ost

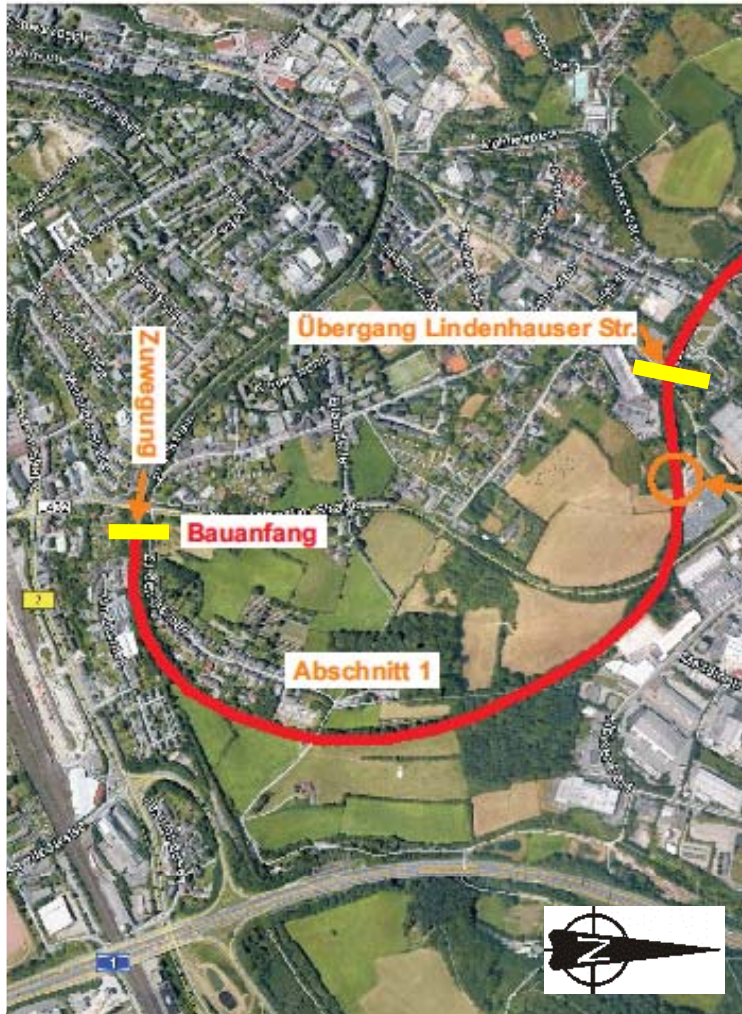

- Baubeginn: September 2013
- Bauzeit: ca. 2-3 Monate
- Länge: ca. 2.000m



Tunnel Schee



- 1. Bauphase Anfang August 2013 beendet
- Umfeldarbeiten im Oktober 2013
- 2. Bauphase April – Juli 2014
- Sommer 2014 Wegebau nördlich und südlich Tunnel




Mustertafel Route - Industriekultur




- 56 Standorte
- Aufstellungsbeginn:
ca. November 2013




LED-Inszenierung

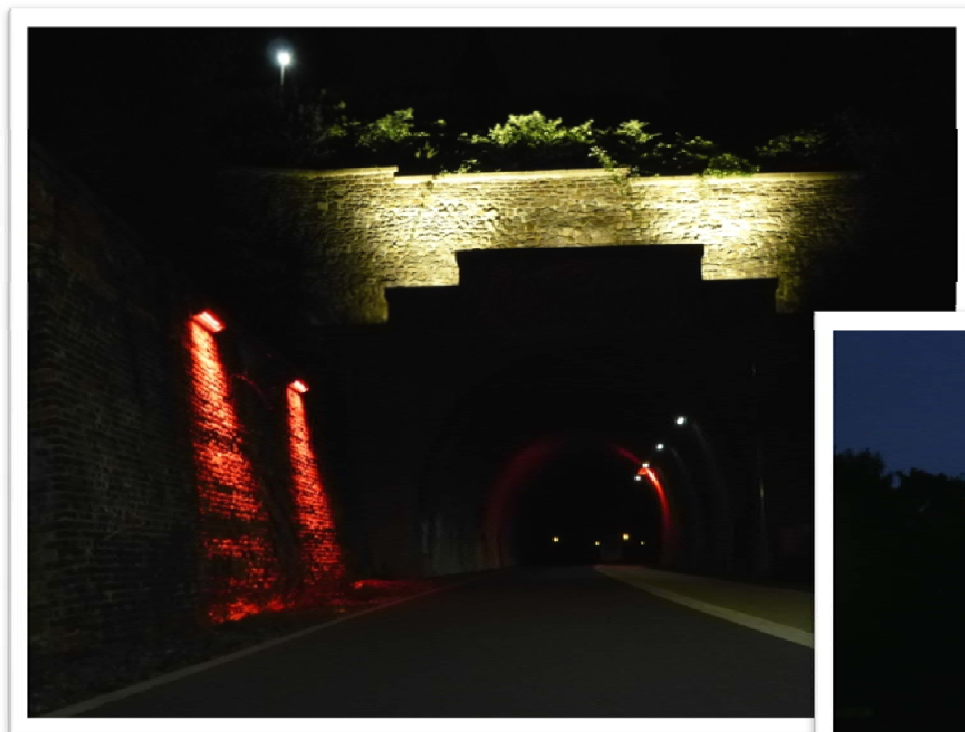

... erfolgreich angeschaltet!

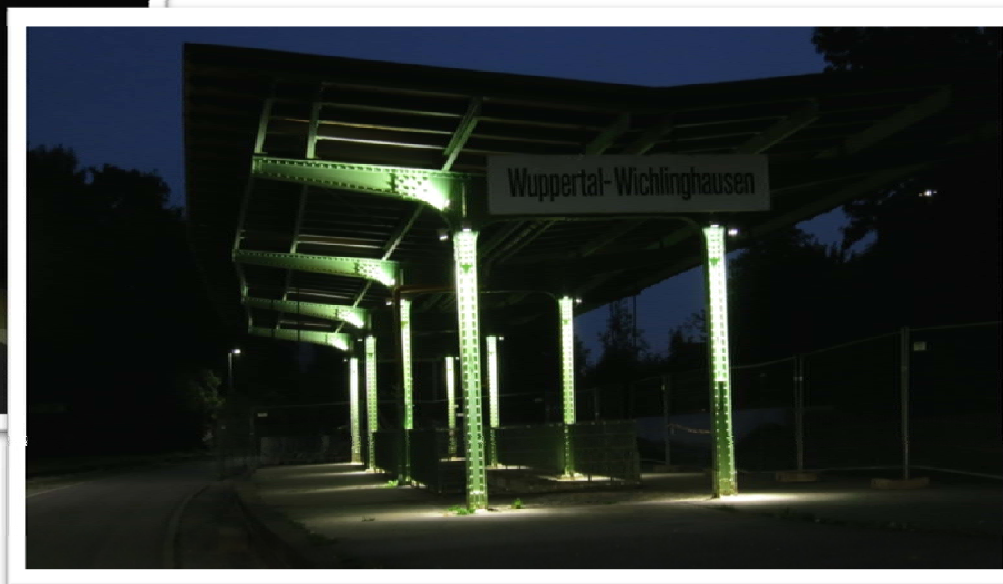

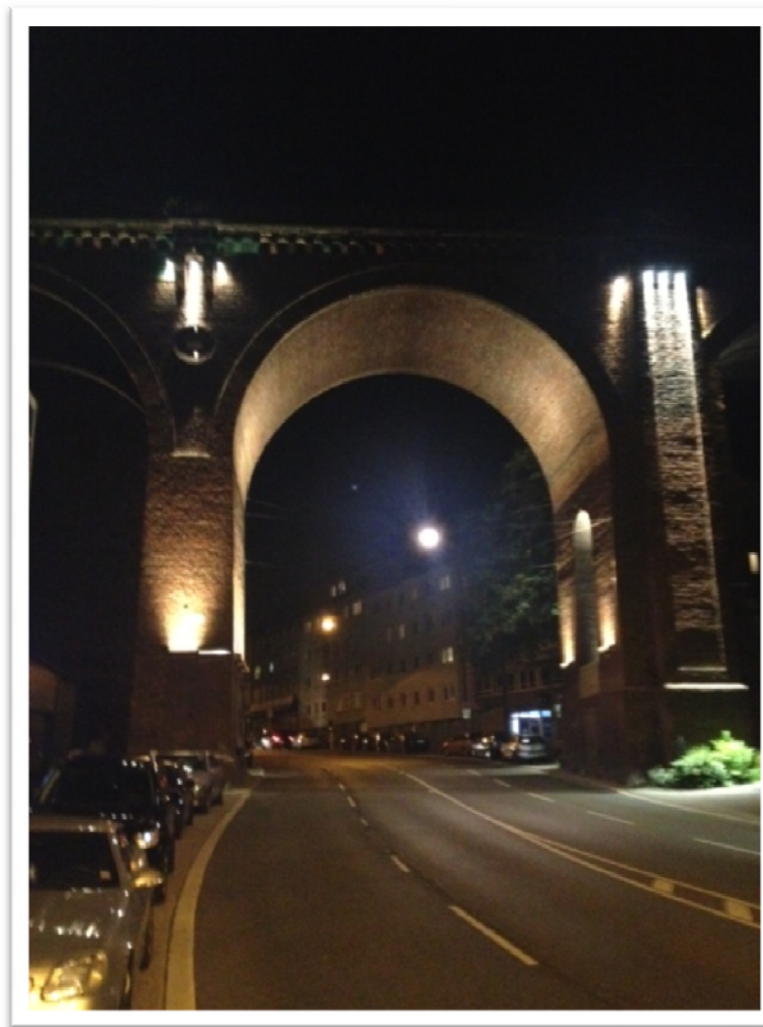

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
