



Stadt Wuppertal

Projektauftritt SAP S/4 HANA

Wuppertal, 27.9.2022

Auftaktveranstaltung SAP S/4 HANA

Agenda

- Grußwort
Herrn Dr. Slawig
- Projektziele
Projektleitung (Herr Korzen und Herr Wolf)
- Projektorganisation
Herr Kraemer (bpc)
- Vorstellung Projektteam
- Weitere Zeitplanung
Herr Kraemer (bpc)
- Nächste Schritte
Herr Kraemer (bpc)
- Fragen


Auftaktveranstaltung SAP S/4 HANA

Grußwort Herr Dr. Slawig



Auftaktveranstaltung SAP S/4 HANA


Projektziele

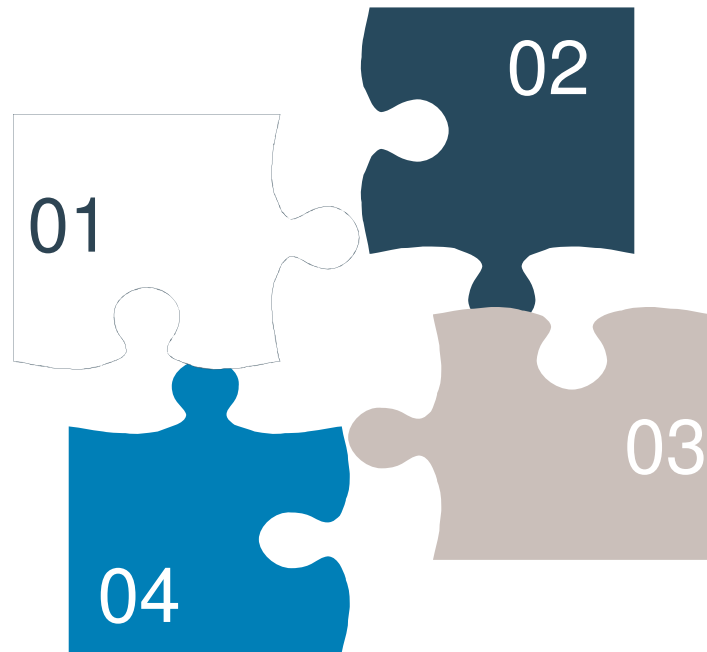

- 01: Modernisierung der SAP Landschaft**
- 02: Prozessoptimierung**
- 03: Nutzerfreundlichkeit**
- 04: Akzeptanz**

Auftaktveranstaltung SAP S/4 HANA

Projektorganisation

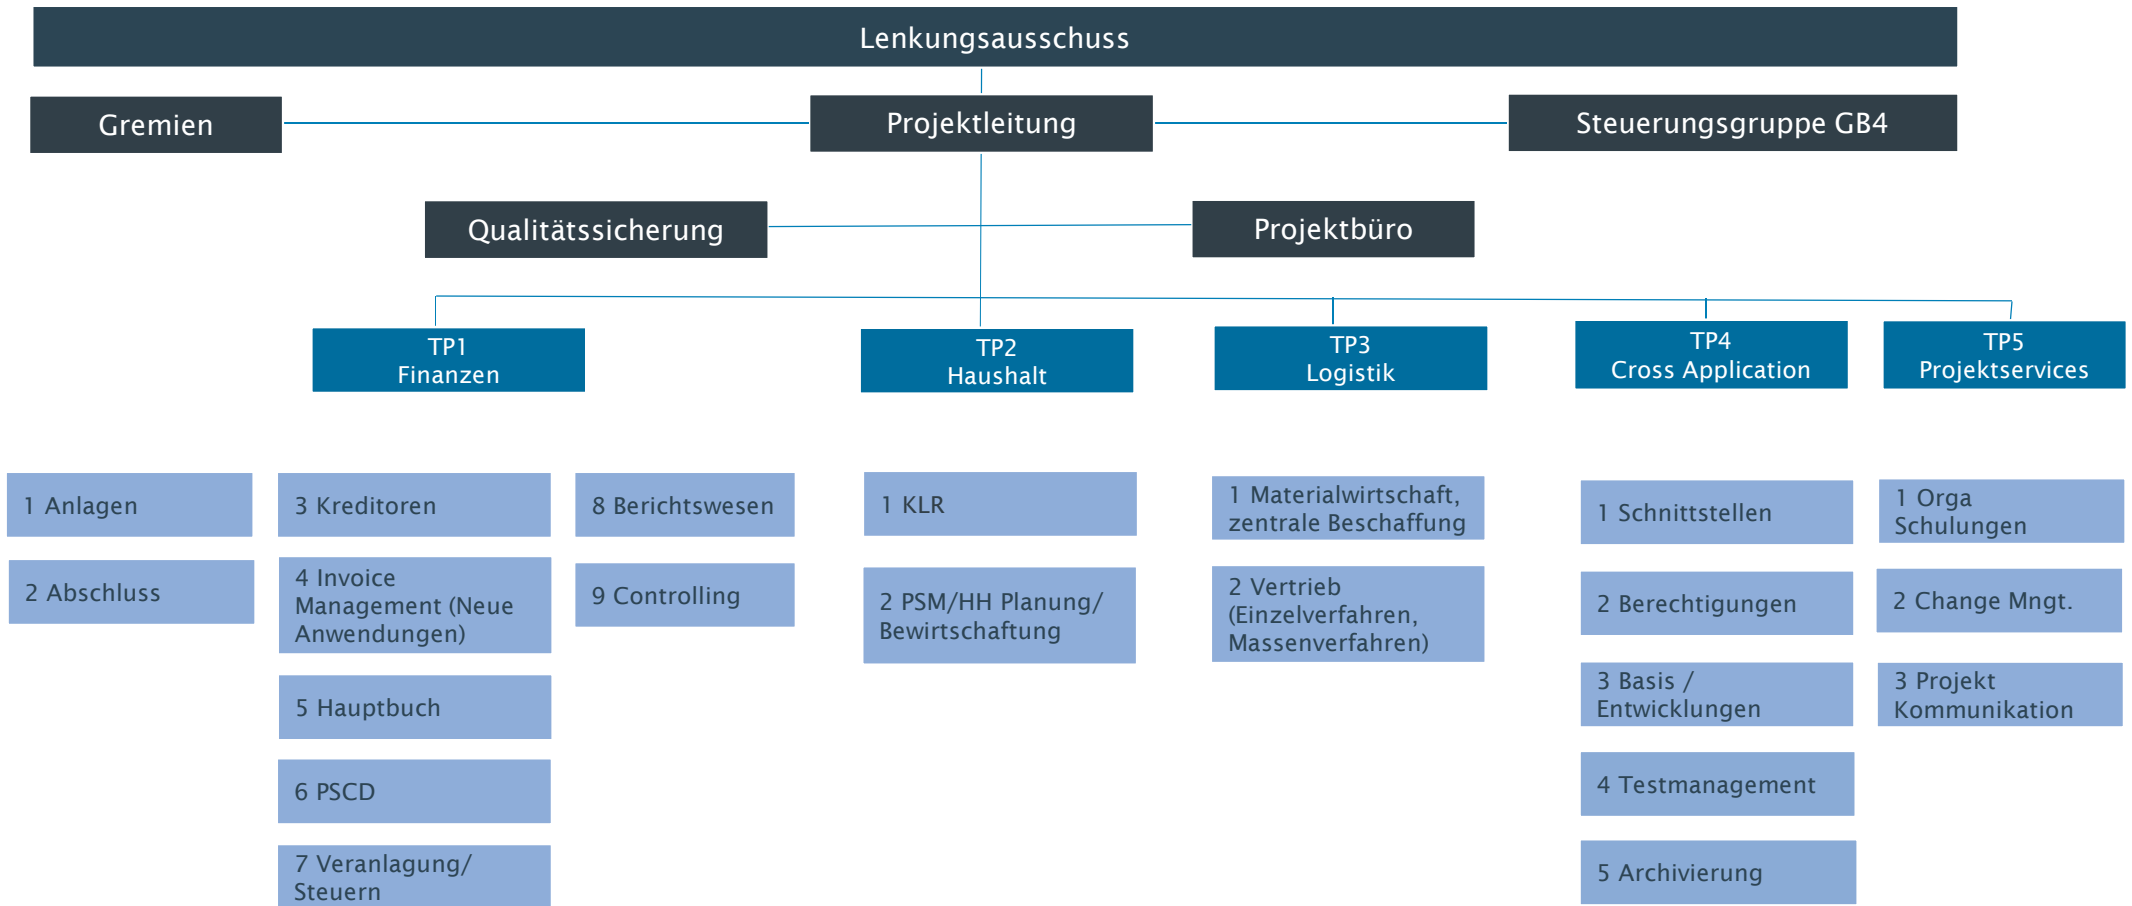

Auftaktveranstaltung SAP S/4 HANA

Projektorganisation Personalie

Diese Folie wird nicht eingeblendet

Finanzen



- Hr. Schmidt (bpc)
- Fr. Steimann (CCC)
- Hr. Köhler (403)
- Hr. Puletto (403)
- Hr. Schäfer (403)
- Hr. Mitchell (403)

Haushalt



- Fr. Eynk (bpc)
- Hr. Samisch (CCC)
- Fr. Wortmann (403)
-

Logistik



- Hr. Kraemer (bpc)
- Hr. Kemper (CCC)
- Herr Zeißler (Zentraleinkauf)
-

Cross Application



- E. Janssen (bpc)
- Hr. Keydel (CCC)
- Hr. Schäfer (403)
- Fr. Gorenzweig (CCC)
- Hr. Seidenzal (403)
-

Projekt Support



- Fr. Meier (bpc)
- Fr. Scholz (CCC)

Auftaktveranstaltung SAP S/4 HANA


Projektorganisation Teilprojekte im Überblick

Diese Folie wird nicht eingeblendet

Finanzen	Haushalt	Logistik	Cross Application	Projekt Services
<p>Das Teilprojekt integriert alle Verwaltungsaufgaben im Bereich Rechnungswesen und ist zuständig für die korrekte Verbuchung über alle Teilprojekte hinweg.</p> <p>Dazu zählen Anlagenbuchhaltung, Abschlusstätigkeiten, Kreditorenbuchhaltung, Invoicemanagement, Hauptbuchhaltung, Kassen- und Einnahmemanagement (PSCD) sowie Veranlagung/Steuern, Berichtswesen und Controlling.</p>	<p>Das Teilprojekt umfasst alle Verwaltungsaufgaben im Bereich Haushaltsmanagement, Fördermittelmanagement, Haushaltsplanerstellung und Druck sowie die Kosten- und Leistungsrechnung.</p>	<p>Das Teilprojekt umfasst alle Verwaltungsaufgaben im Bereich Logistik und ist zuständig für das Materialmanagement, den Einkauf sowie Verkaufsprozesse im Vertrieb.</p>	<p>Das Teilprojekt umfasst alle übergreifenden technischen Fragestellungen und Implementierungen. Dazu zählen die Entwicklung und der Betrieb von Schnittstellen, die technische Realisierung der Migrationsanforderungen, das Berechtigungsmanagement, Systemarchitektur, Systembetrieb und Entwicklungen, das Testmanagement und die Testdurchführung sowie die Archivierung.</p>	<p>Das Teilprojekt umfasst sämtliche administrativen Aufgaben, die im Rahmen der Projektabwicklung erforderlich werden. Hierzu zählen die Organisation und Durchführung von Schulungen, das Change Management und die Projektorganisation.</p> <p>- Koordination, Schnittstelle</p>

Auftaktveranstaltung SAP S/4 HANA

Zeitplanung

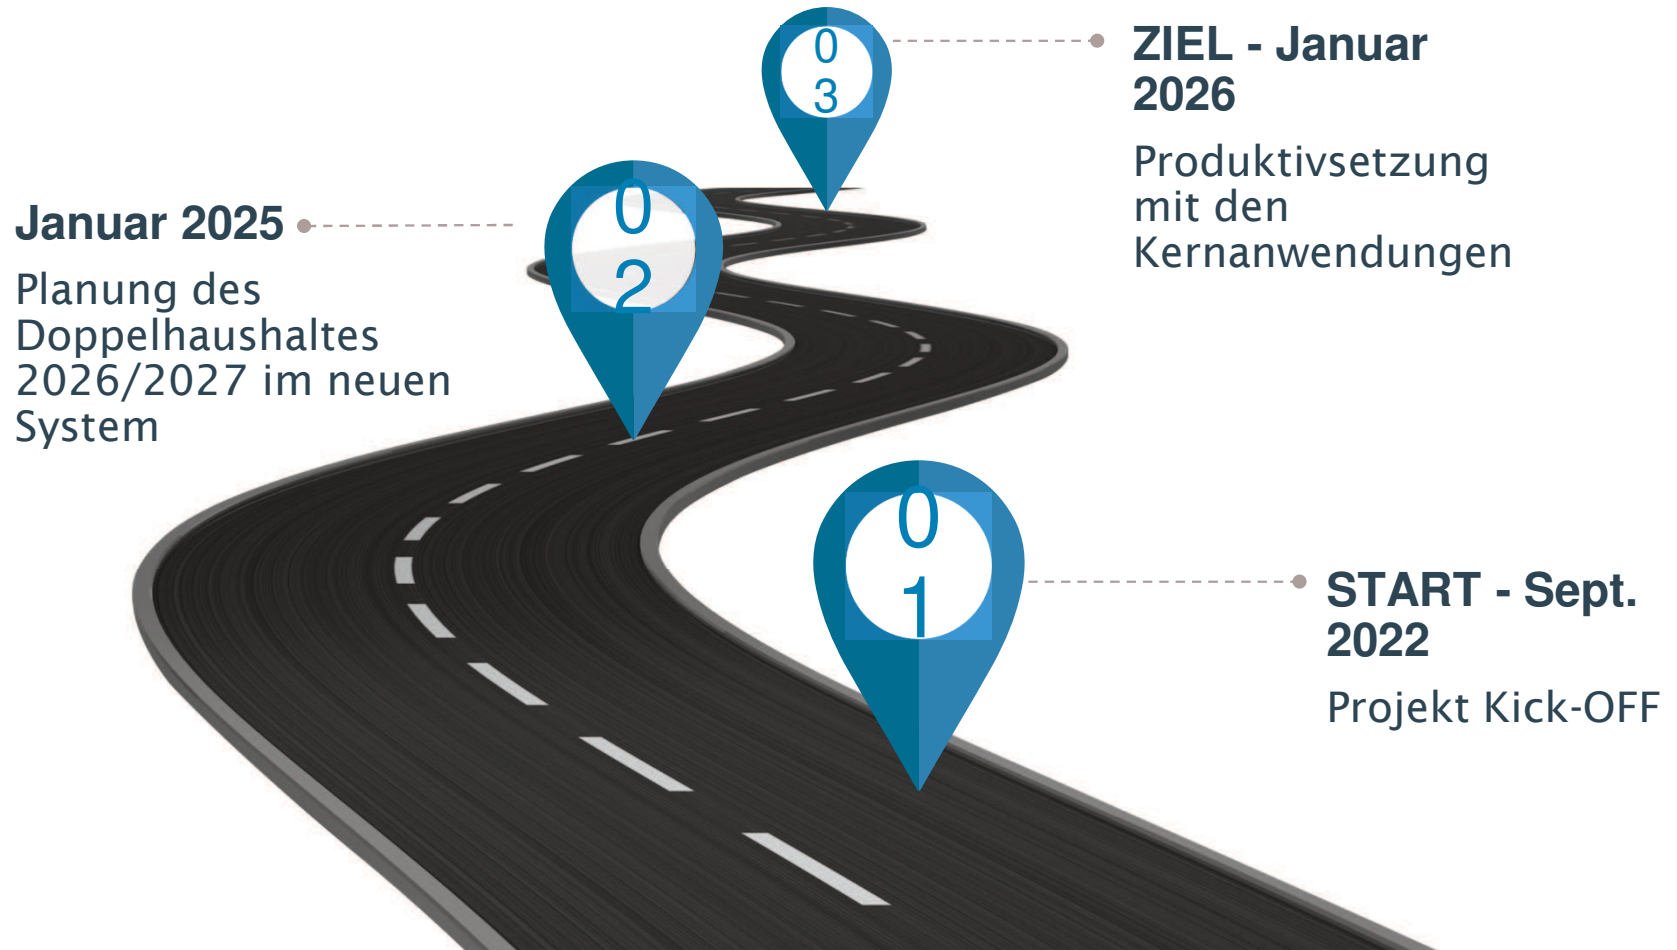

Auftaktveranstaltung SAP S/4 HANA


Weitere Zeitplanung (Meilensteine)

Definition:

Die Erreichung eines Meilensteins umfasst den termingerechten Abschluss einer Projektphase auch hinsichtlich der festgelegten Kosten- und Qualitätsanforderungen. Das nicht Erreichen eines Meilensteins hat unmittelbare Auswirkungen auf den Beginn von Folgephasen, das Projektbudget und die geplante Projektlaufzeit.

Auftaktveranstaltung SAP S/4 HANA

Weitere Zeitplanung (komprimierte Darstellung)

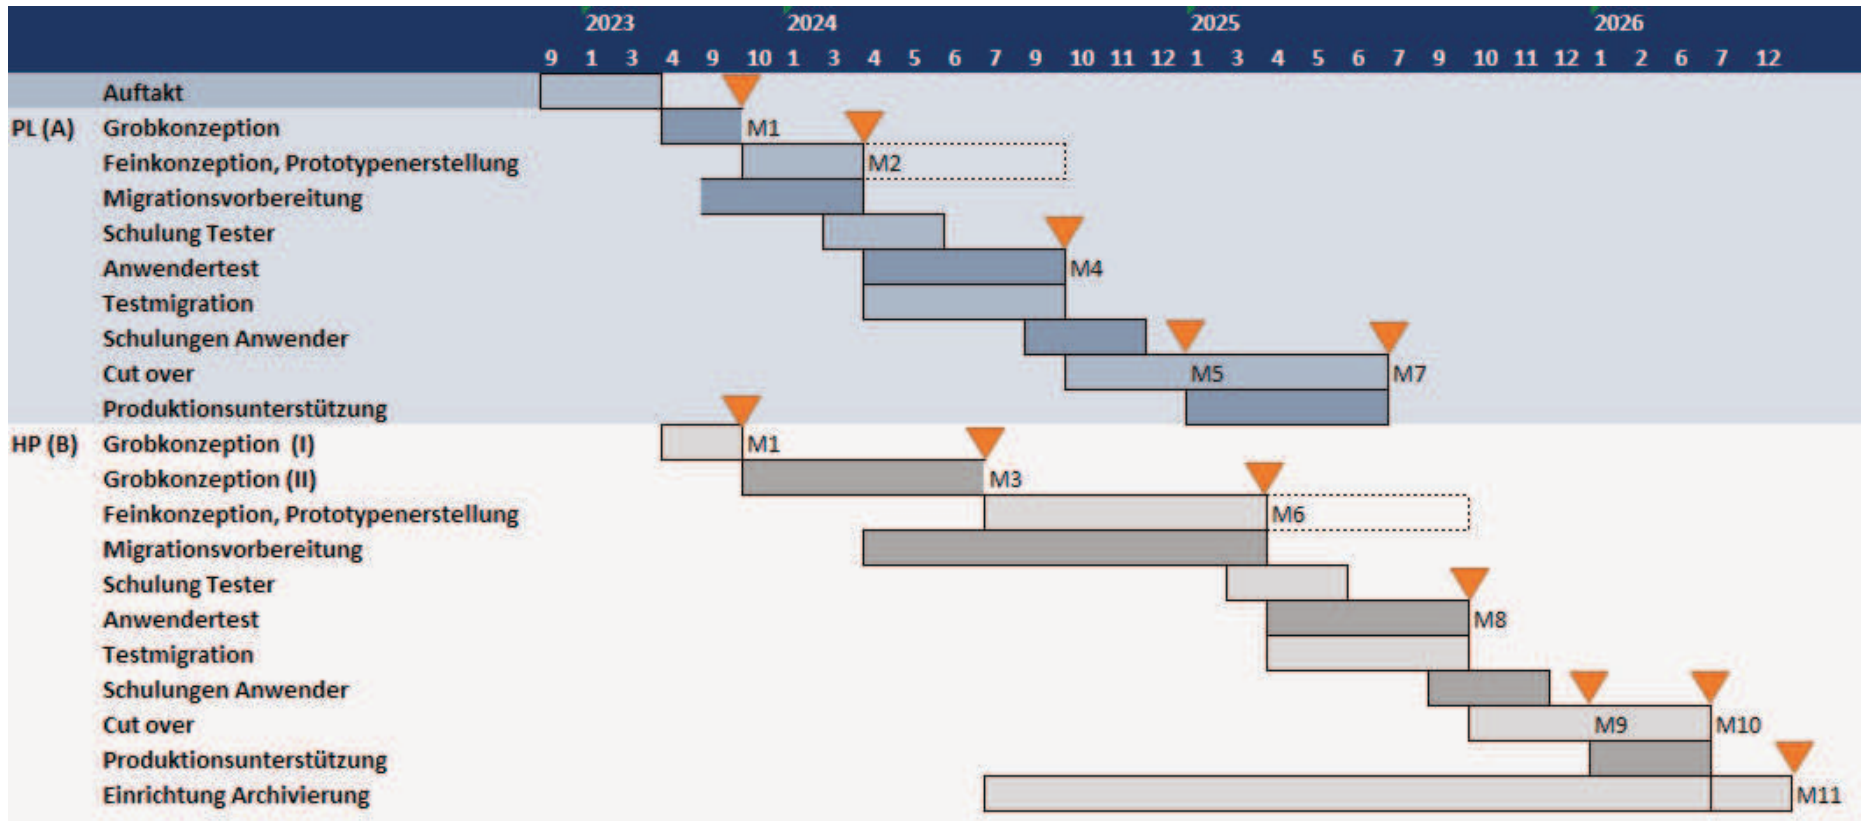


Auftaktveranstaltung SAP S/4 HANA

Weitere Zeitplanung (Meilensteine)

Diese Folie wird nicht
eingebildet



M1 (30.09.2023): Die Grobkonzeption Haushaltsplanung ist abgeschlossen. Die Grobkonzeption Kernprojekt liegt insoweit vor, dass die maßgeblichen Integrationsanforderungen definiert sind, um nachträglich Auswirkungen auf den Planungsprozess zu vermeiden.



M2 (31.03.2024): Das Feinkonzept und die Entwicklung des Prototypen zur Haushaltsplanung ist abgeschlossen. Die Migrationsvorbereitungen sind abgeschlossen, so dass die techn. Migration evaluiert werden kann. Das Produktionssystem steht für Testmigrationen zur Verfügung.



M3 (30.06.2024): Die Grobkonzeption des Kernprojekts ist abgeschlossen.

Auftaktveranstaltung SAP S/4 HANA

Weitere Zeitplanung (Meilensteine)


Diese Folie wird nicht eingeblendet



M4 (30.09.2024): Die Anwendertests zur Haushaltsplanung sind erfolgreich abgeschlossen. Alle definierten Prozesse wurden erfolgreich geprüft. Notwendige Änderungen am Prototypen umgesetzt und in der Feinkonzeption dokumentiert. Die Testmigration konnte erfolgreich abgeschlossen werden.



M5 (01.01.2025): Produktionsstart der Haushaltsplanungsanwendungen.



M6 (31.03.2025): Das Feinkonzept und die Entwicklung des Prototypen zum Kernprojekt ist abgeschlossen. Die Migrationsvorbereitungen sind abgeschlossen, so dass die techn. Migration evaluiert werden kann. Das Produktionssystem steht für Testmigrationen zur Verfügung.

Auftaktveranstaltung SAP S/4 HANA

Weitere Zeitplanung (Meilensteine)

Diese Folie wird nicht
eingebildet



M7 (30.06.2025): Cutover Phase Haushaltsplanung sowie Produktionsunterstützung ist abgeschlossen. Alle Funktionen laufen stabil, die Anwender können das System ohne erweiterte Unterstützung nutzen.



M8 (30.09.2025): Die Anwendertests zum Kernprojekt sind erfolgreich abgeschlossen. Alle definierten Prozesse wurden erfolgreich geprüft. Notwendige Änderungen am Prototypen umgesetzt und in der Feinkonzeption dokumentiert. Die Testmigration konnte erfolgreich abgeschlossen werden.



M9 (01.01.2026): Produktionsstart der Kernanwendungen.

Auftaktveranstaltung SAP S/4 HANA

Weitere Zeitplanung (Meilensteine)

Diese Folie wird nicht
eingebildet



M10 (30.06.2026): Cutover Phase Kernprojekt sowie Produktionsunterstützung ist abgeschlossen. Alle Funktionen laufen stabil, die Anwender können das System ohne erweiterte Unterstützung nutzen.



M11 (31.12.2026): Die Anbindung der SAP Archivierungsobjekte ist abgeschlossen (Weitere Objekte ggf. zum jeweiligen Produktionsstart).

Auftaktveranstaltung SAP S/4 HANA

Ausblick: die nächsten Schritte (bis März 2023)

- Erstellung Projekthandbuch
- Durchführung der Delta Schulungen
- Einrichtung der Teams
- Einrichtung der Gremien und Infrastruktur
- Analyse der Berichtsanforderungen
- Erste Workshops zur Systemarchitektur und -integration
- Definition der Aufgabenpakete für den weiteren Projektverlauf

Auftaktveranstaltung SAP S/4 HANA

Schulungskonzept – Qualifikation zu Projektbeginn

Inhalte



- Teambuilding
- Change-Prozess / Projektkommunikation
- Überblick zu Änderungen von Prozessen, Strukturen und Funktionalitäten unter S/4HANA
- Schwerpunkte bei der Fachkonzeption

Zielsetzung



- ✓ Frühzeitiger Know-how-Transfer
- ✓ Sicherstellung einer hochwertigen Mitarbeit der Stadt Wuppertal
- ✓ Schaffung einer gemeinsamen Basis für die späteren Workshops und die Konzeption

Werkzeuge



- bpc S/4-Master für Kommunen
- Themen- bzw. modulspezifische Qualifikationsmaßnahmen

Zielgruppe



- Projektteam
 - Power-User
 - MA des SAP-CCC, inkl. Fachsupport

Vielen Dank für Ihre/Eure Aufmerksamkeit!

Fragen & Antworten
